


# 送電線工事の進捗状況

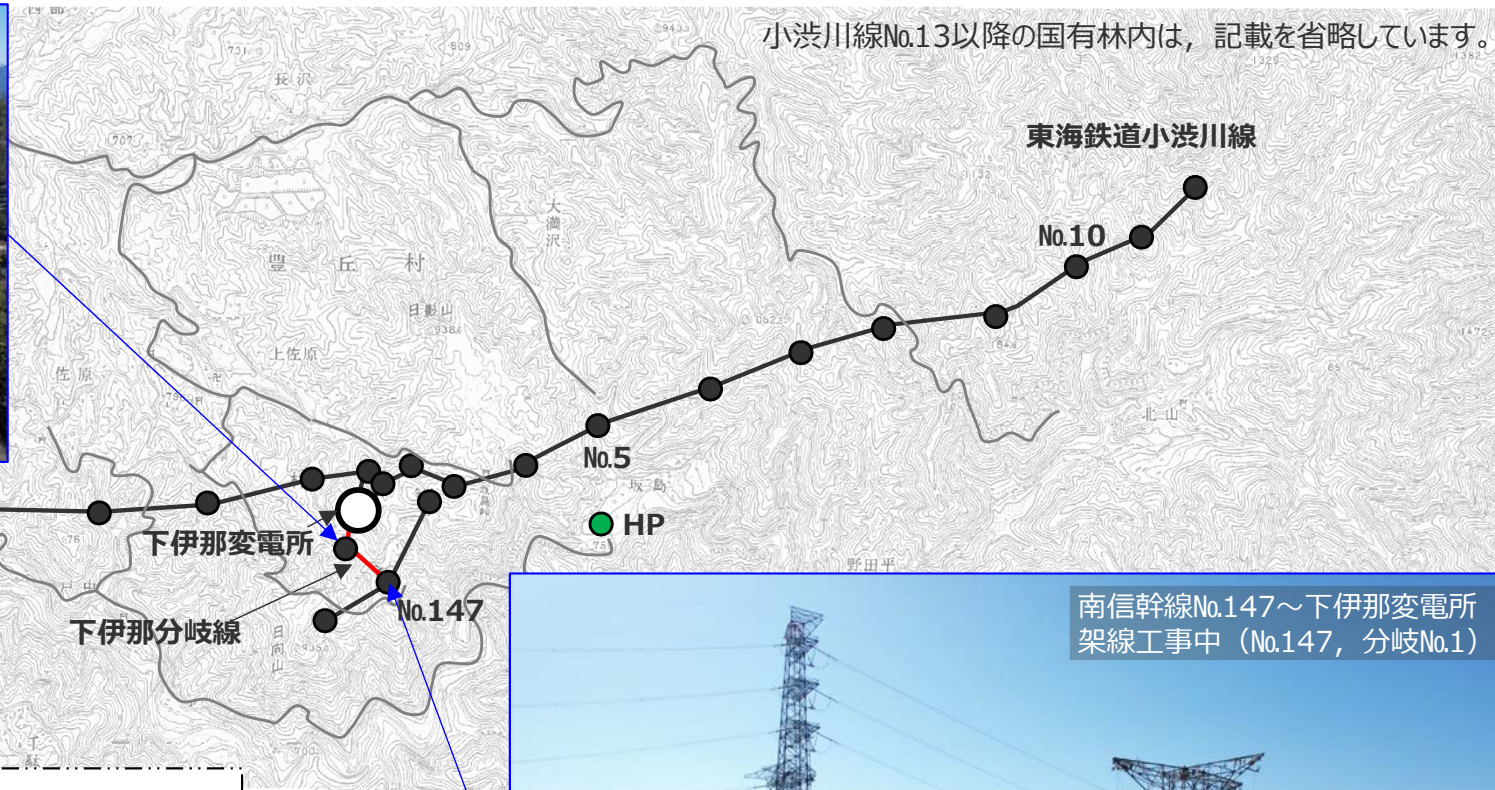

- 凡例
- : 架線工事中
  - : 架線工事完了
  - : 完了

	完了基数 (豊丘村内)				
	伐採	仮設	基礎	組立	架線
下伊那南信幹	2/2 基	2/2 基	2/2 基	2/2 基	2/4 径間
豊丘線	9/9 基	10/10 基	10/10 基	10/10 基	10/11 径間
小渋川線	20/20 基	20/20 基	20/20 基	20/20 基	21/21 径間
