



中部電力パワーグリッド



# 第30回豊丘村リニア対策委員会説明資料


## リニア関連電力供給設備

2025年1月30日

中部電力パワーグリッド(株)  
リニア関連送変電工事所



# 下伊那変電所 工事の状況（１）

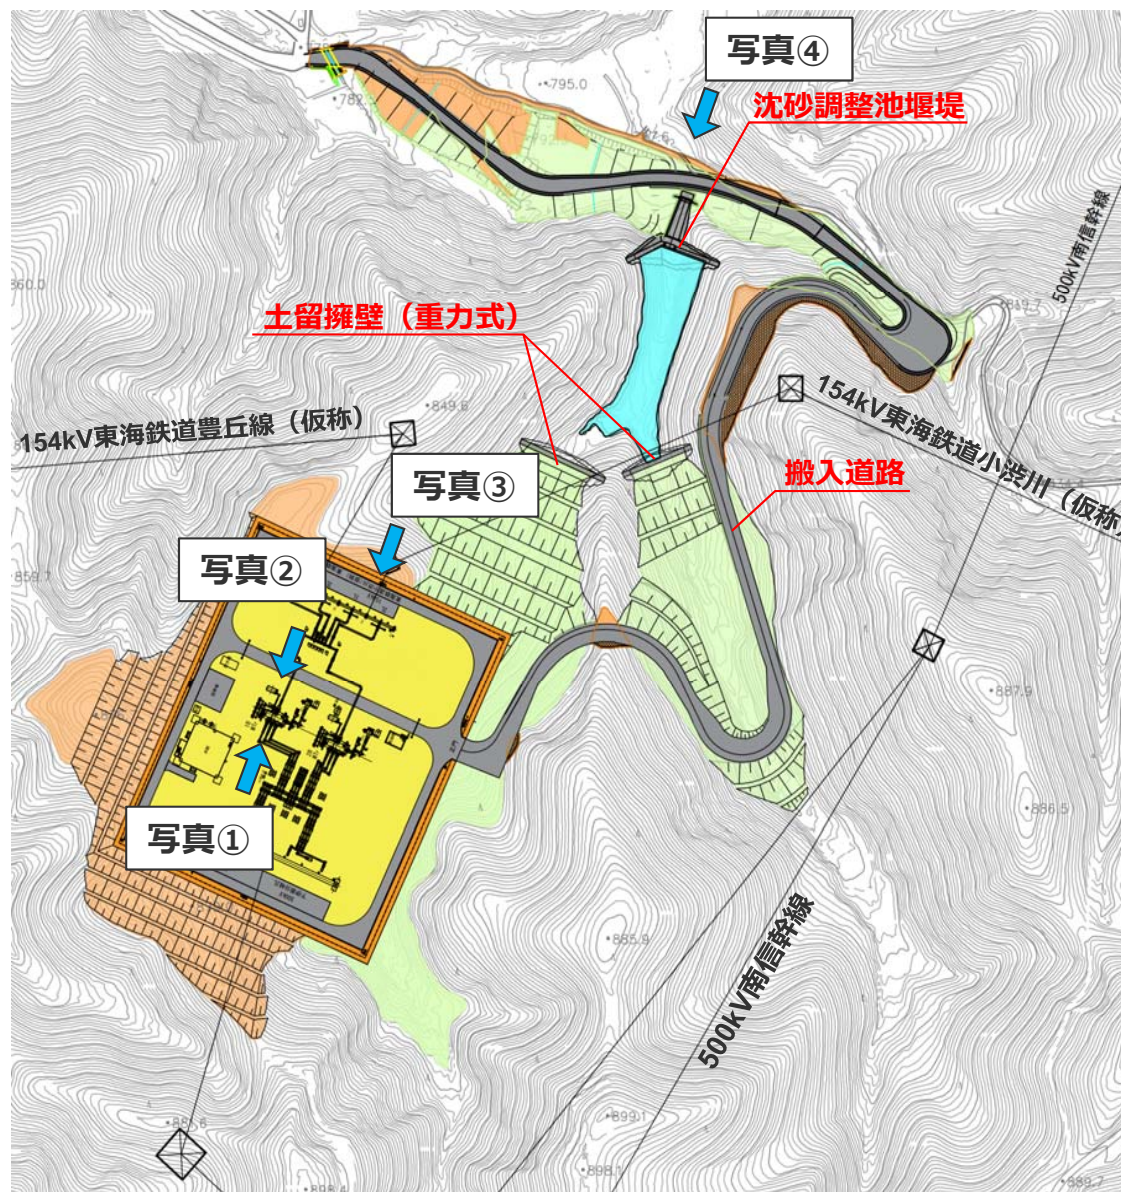

写真① 154 k V機器組立状況



写真② 154 k V機器組立状況





# 下伊那変電所 工事の状況（２）

写真③

変電所工事状況（上空より）





# 下伊那変電所 工事の状況（3）

写真④ 下伊那変電所全景（上空より）




# 変電所工事スケジュール

|                         | 2019年度 |    | 2020年度 |    | 2021年度 |    | 2022年度           |    | 2023年度 |    | 2024年度 |    | 2025年度 |    |
|-------------------------|--------|----|--------|----|--------|----|------------------|----|--------|----|--------|----|--------|----|
|                         | 上期     | 下期 | 上期     | 下期 | 上期     | 下期 | 上期               | 下期 | 上期     | 下期 | 上期     | 下期 | 上期     | 下期 |
| 官 庁 願 書                 |        |    |        |    |        |    | ▼48条・9条 (2021.7) |    |        |    |        |    |        |    |
| ( 土 木 工 事 )<br>沈砂調整池・擁壁 |        |    |        |    |        |    |                  |    |        |    |        |    |        |    |
| 搬入路・土地造成                |        |    |        |    |        |    |                  |    |        |    |        |    |        |    |
| 機器基礎・ダクト                |        |    |        |    |        |    |                  |    |        |    |        |    |        |    |
| ( 建 築 工 事 )<br>本 館      |        |    |        |    |        |    |                  |    |        |    |        |    |        |    |
| ( 電 気 工 事 )<br>接 地 線 他  |        |    |        |    |        |    |                  |    |        |    |        |    |        |    |
| 変 圧 器 据 付               |        |    |        |    |        |    |                  |    |        |    |        |    |        |    |
| 500kV機器据付               |        |    |        |    |        |    |                  |    |        |    |        |    |        |    |
| 154kV機器据付               |        |    |        |    |        |    |                  |    |        |    |        |    |        |    |
| 盤 関 係                   |        |    |        |    |        |    |                  |    |        |    |        |    |        |    |
| ( 試 験 )<br>総 合 動 作 試 験  |        |    |        |    |        |    |                  |    |        |    |        |    |        |    |
| 法定使用前自主検査               |        |    |        |    |        |    |                  |    |        |    |        |    |        |    |



# 送電線工事の進捗状況（豊丘村）

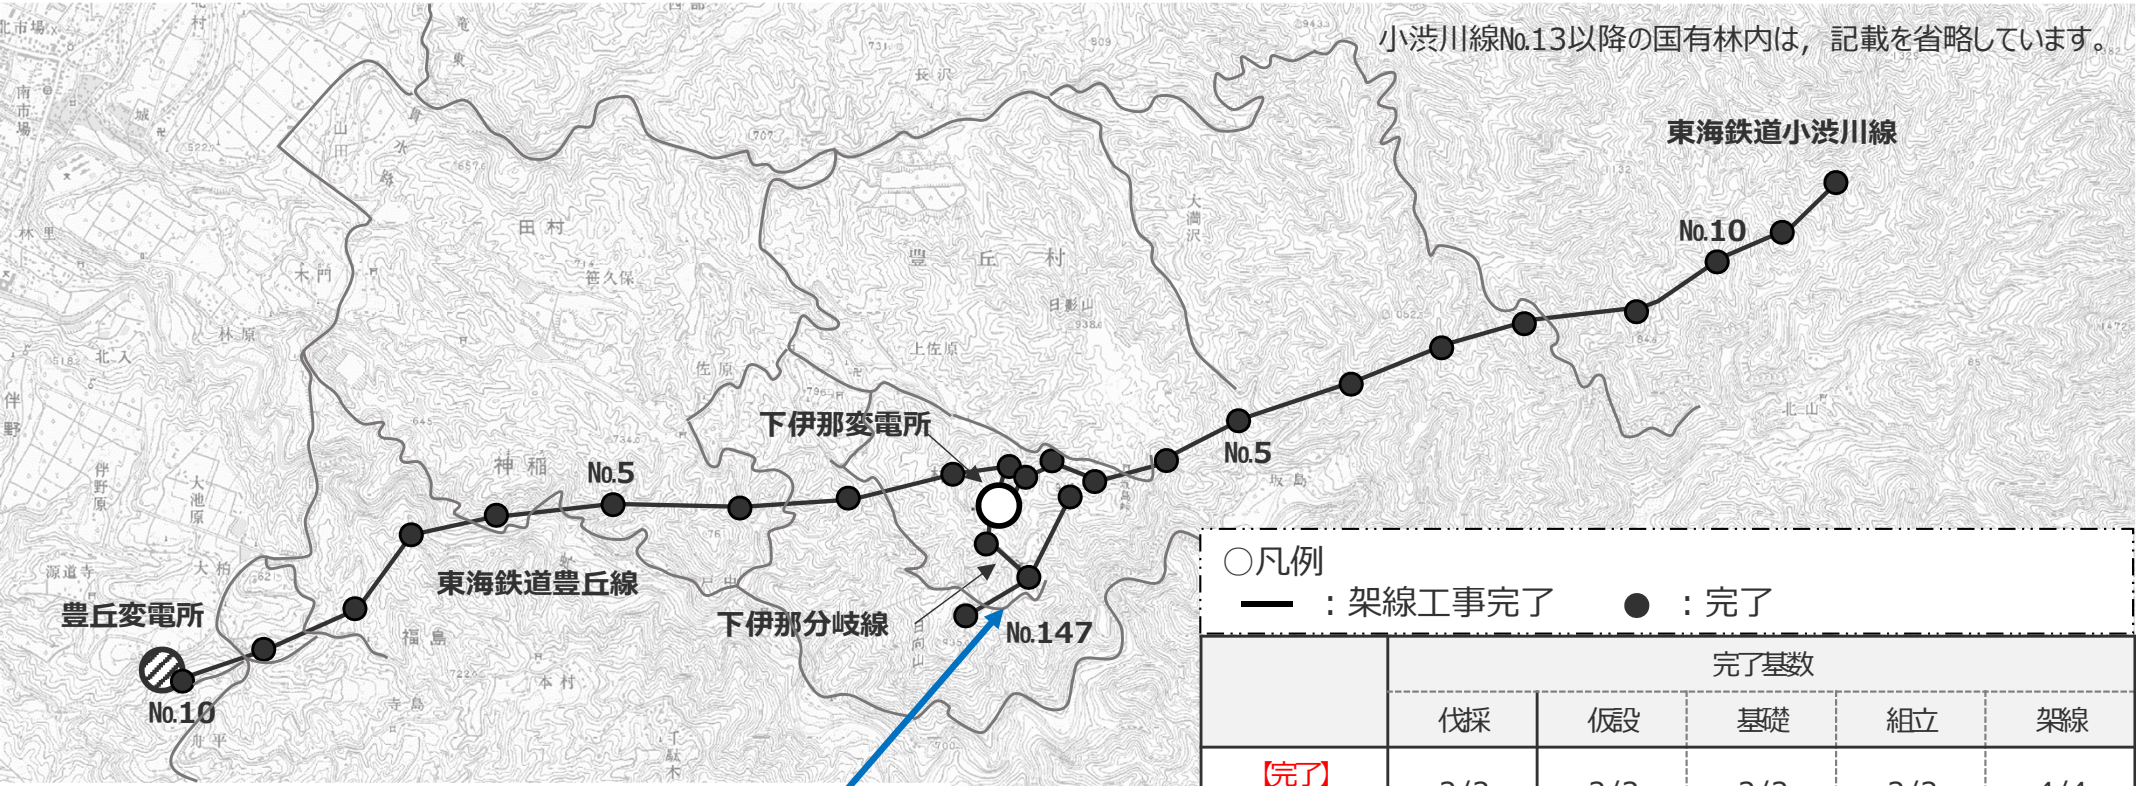

○凡例  
— : 架線工事完了 ● : 完了

|                    | 完了基数       |            |            |            |             |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|                    | 伐採         | 仮設         | 基礎         | 組立         | 架線          |
| 【完了】<br>下伊那<br>南信幹 | 2/2<br>基   | 2/2<br>基   | 2/2<br>基   | 2/2<br>基   | 4/4<br>径間   |
| 豊丘線                | 9/9<br>基   | 10/10<br>基 | 10/10<br>基 | 10/10<br>基 | 10/11<br>径間 |
| 【完了】<br>小渋川線       | 20/20<br>基 | 20/20<br>基 | 20/20<br>基 | 20/20<br>基 | 21/21<br>径間 |

# 送電線工事のスケジュール（豊丘村）

| 地区名 |     | 2020年度     |          | 2021年度    |      | 2022年度 |      | 2023年度 |      | 2024年度 |      | 2025年度 |      |
|-----|-----|------------|----------|-----------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
|     |     | 4～9        | 10～3     | 4～9       | 10～3 | 4～9    | 10～3 | 4～9    | 10～3 | 4～9    | 10～3 | 4～9    | 10～3 |
| 林区  | 野田平 | 小渋川線（5～20） |          |           |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
|     | 上佐原 | 小渋川線（1～4）  |          |           |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
|     |     |            | 豊丘線（1～3） |           |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
|     | 下佐原 | 豊丘線（4～5）   |          |           |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
|     | 木門  |            | 豊丘線（6）   |           |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
| 福島区 | 本村  |            | 豊丘線（7）   |           |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
|     | 寺島1 |            |          | 豊丘線（8）    |      |        |      |        |      |        |      |        |      |
|     | 大柏  |            |          | 豊丘線（9～10） |      |        |      |        |      |        |      |        |      |


## <凡例>

-  : 小渋川線の工事
-  : 豊丘線の工事
-  : 南信幹線の工事
-  : 架線工事
-  : 休工（止め山等）

最終鉄塔～変電所間の架線工事は J R 東海さまと調整中



# 工事車両通行ルート

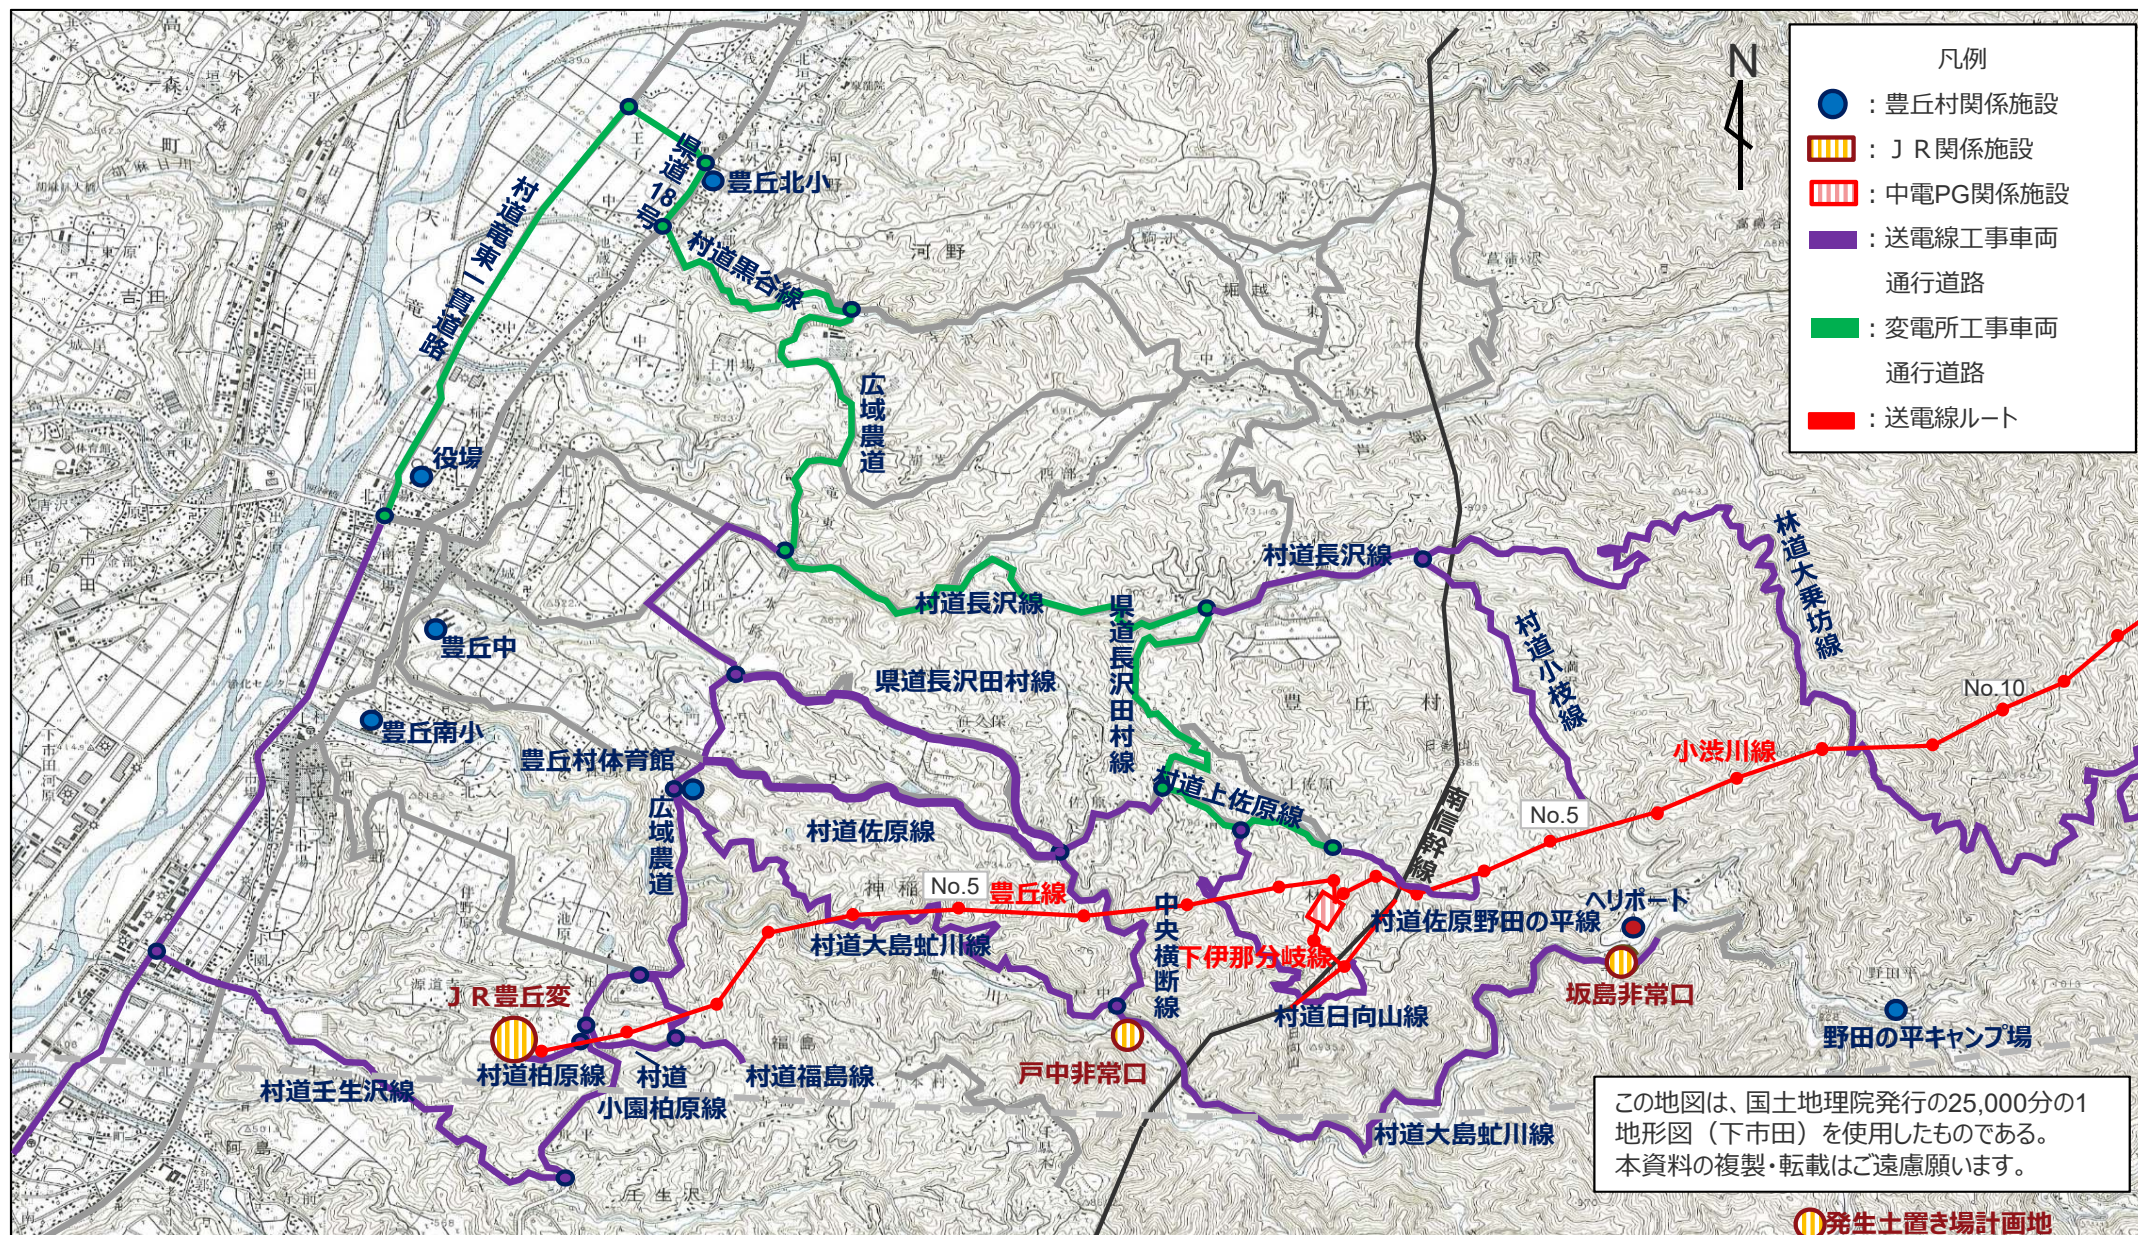



## ■中部電力パワーグリッド株式会社 リニア関連送変電工事所

〒507-8527 岐阜県多治見市上野町5-1

TEL 0572-74-6902 fax 050-7771-3377

土日・祝日を除く、午前9時～午後4時30分まで





中部電力パワーグリッド
