



中部電力パワーグリッド




第26回豊丘村リニア対策委員会説明資料

リニア関連電力供給設備

2022年10月26日

中部電力パワーグリッド(株)
リニア関連送変電工事所

下伊那変電所 工事の状況 (1)

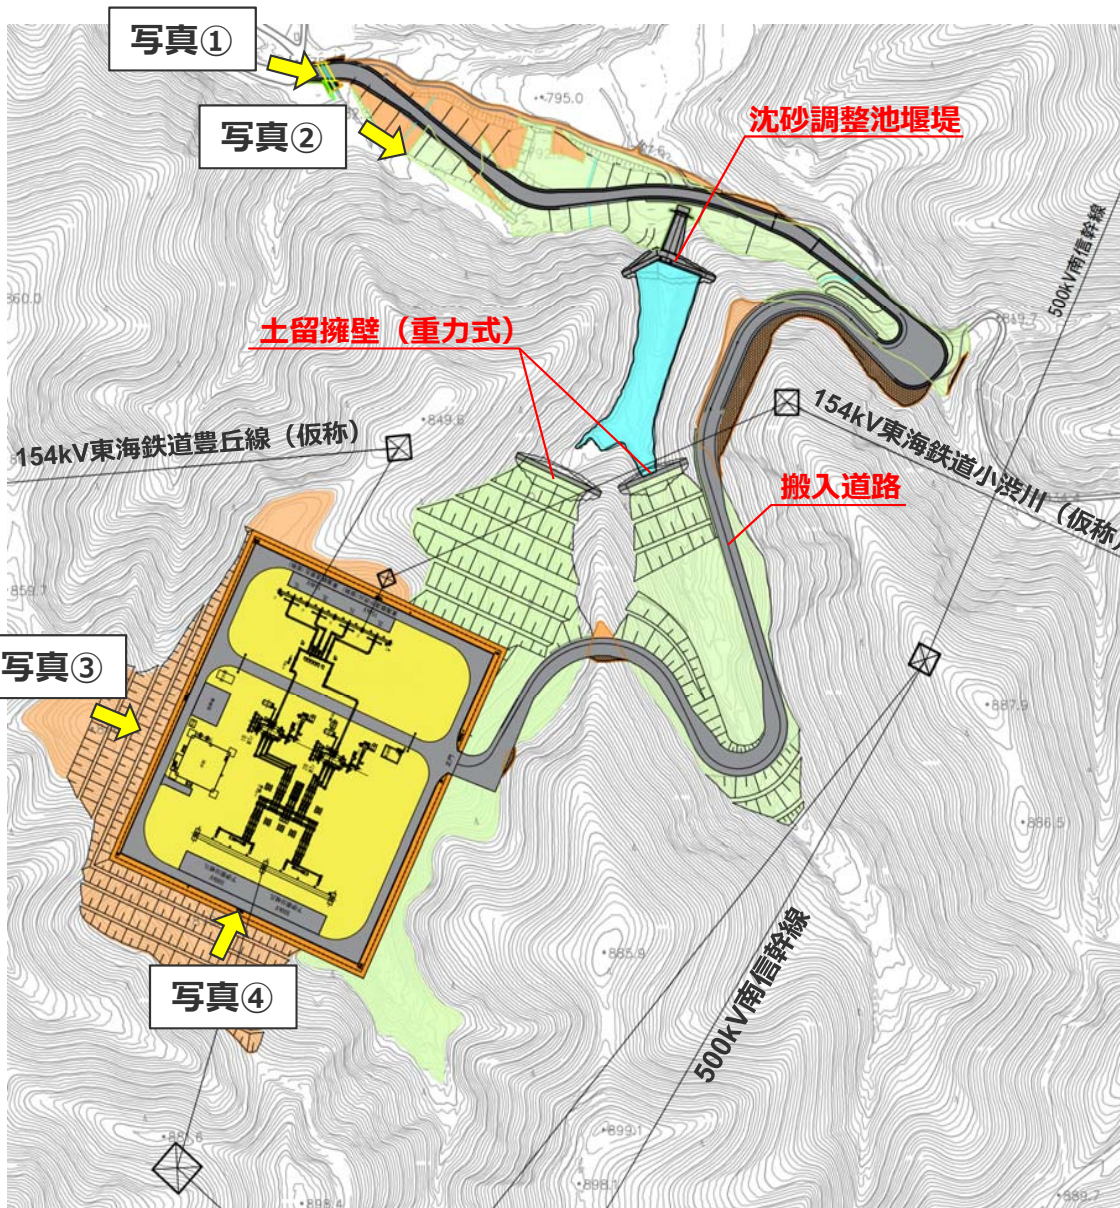

写真① 変電所下流水路構築状況 (流末部)



写真② 変電所下流水路構築状況 (水路部)



下伊那変電所 工事の状況 (2)

写真③ 変電所工事状況 (西側より)




写真④ 変電所工事状況 (南側より)



下伊那変電所 工事の状況 (3)


⑤下伊那変電所全景 (上空より)

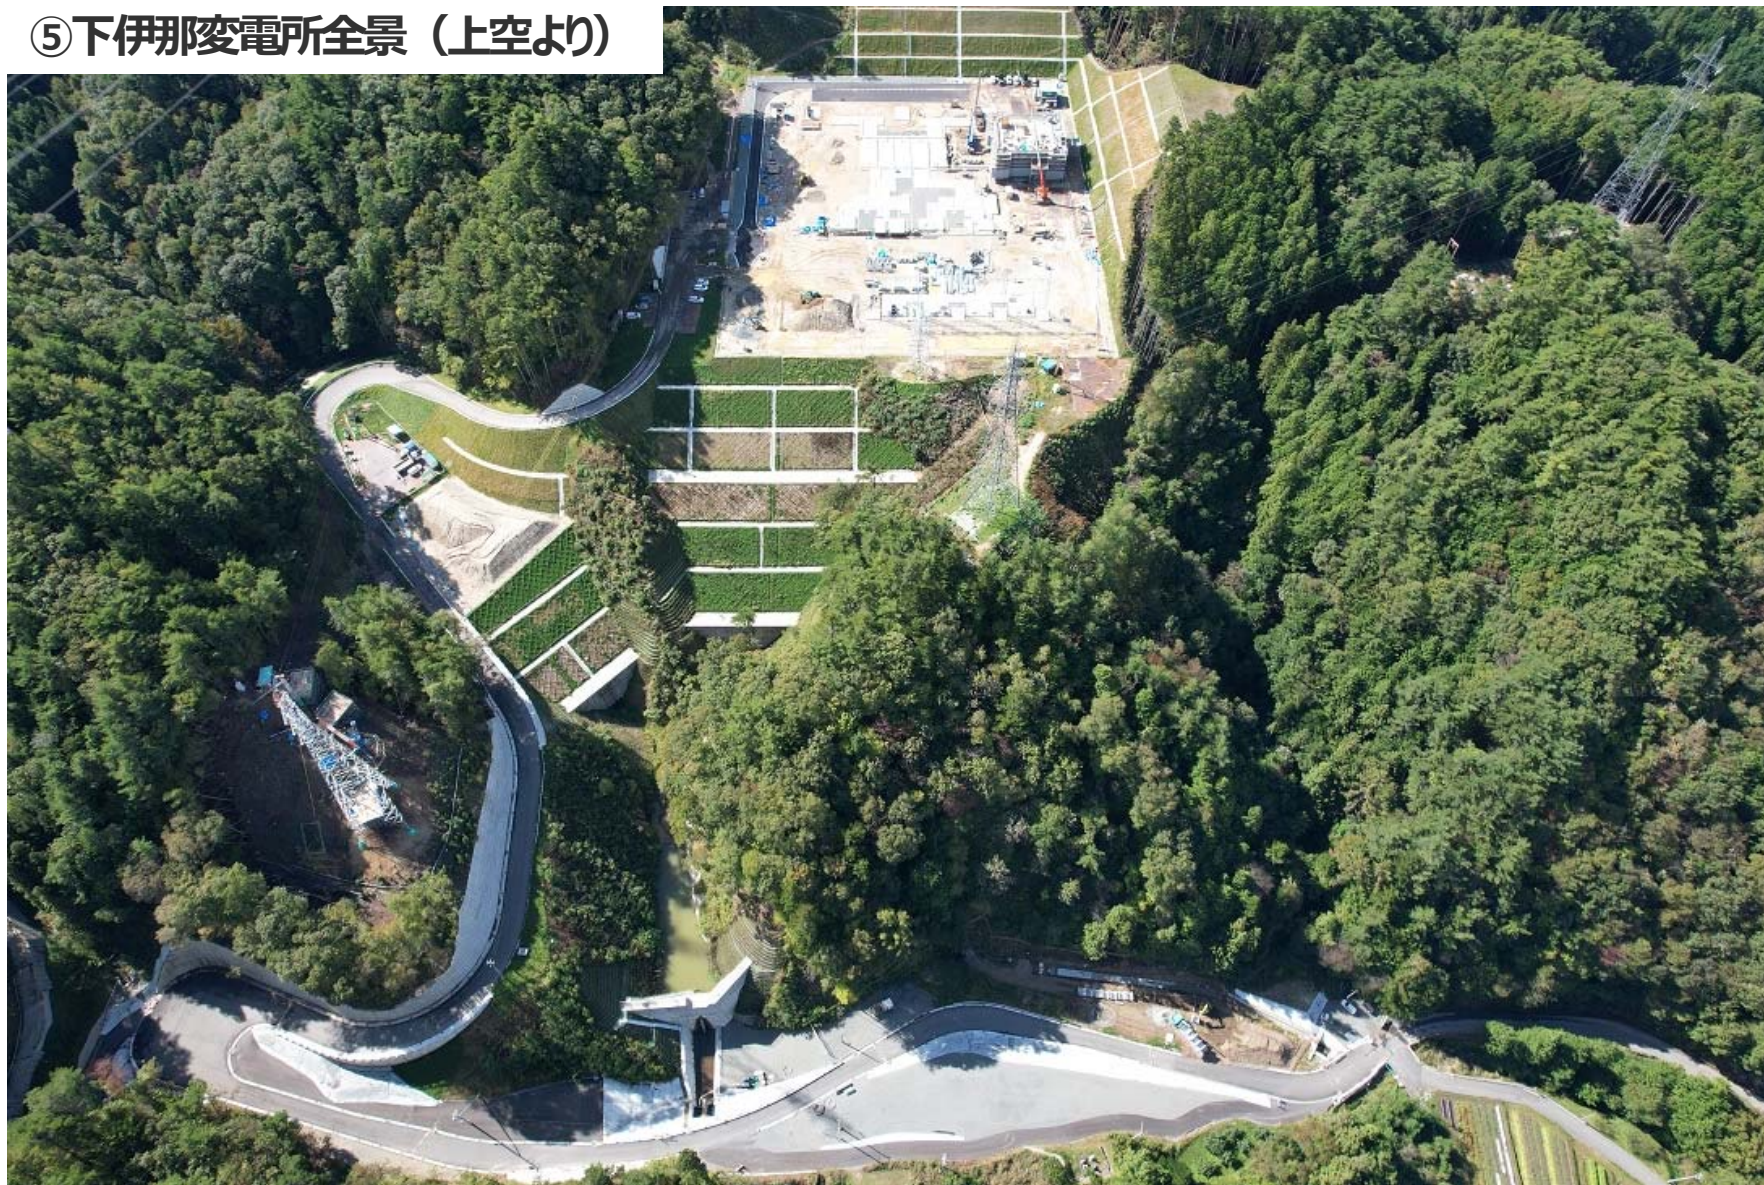

下伊那変電所 工事スケジュール

	2019年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		2024年度	
	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期
官庁願書			電気事業法48・9条(2021.7)▽									
(土木工事)												
沈砂調整池・擁壁	■											
搬入路・	■											
土地造成			■									
機器基礎、ダクト					■							
(建築工事)												
本館					■							
(電気工事)												
500kV 機器据付									■			
154kV 機器据付											■	
変圧器据付									■			
盤関係									■			
仮設・接地線ほか					■							
(試験)												
総合諸試験											■	
法定使用前自主検査											■ ■ ▽ 2024/10 運開	

送電線工事の進捗状況（豊丘村）

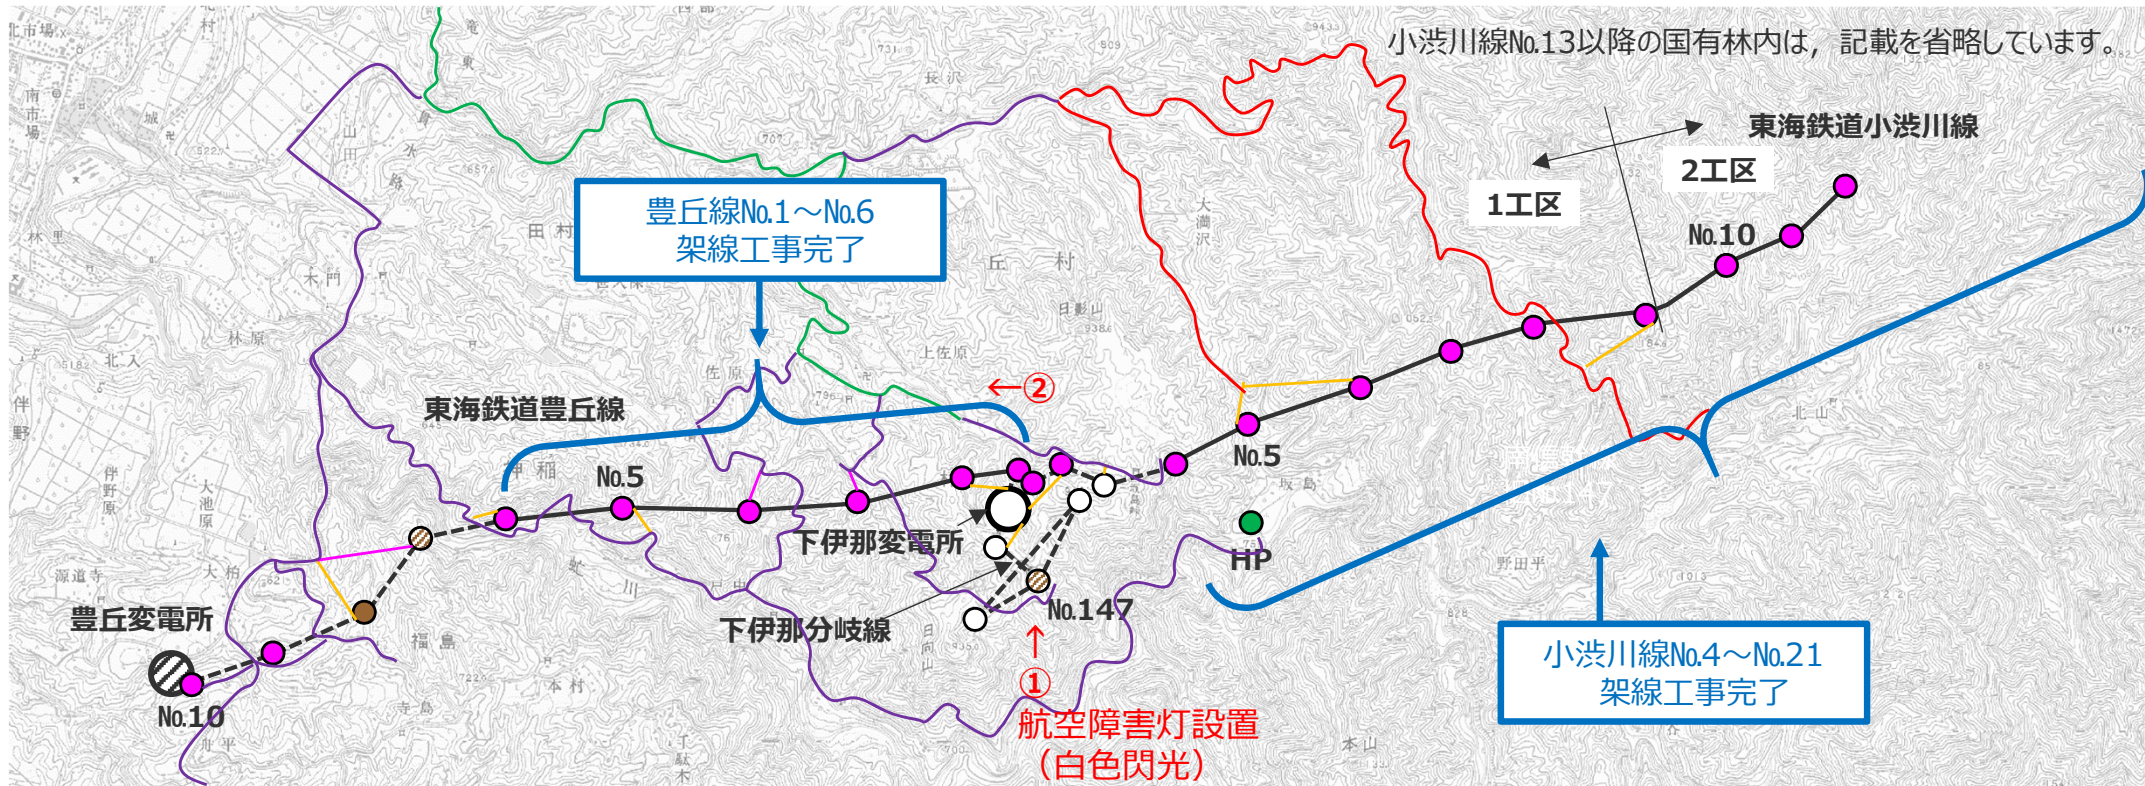

○凡例

- (green) : 仮設工事中 ● (green) : 仮設工事完了
- (brown) : 基礎工事中 ● (brown) : 基礎工事完了
- (pink) : 組立工事中 ● (pink) : 組立工事完了
- (red) : 架線工事中 — (black) : 架線工事完了
- (yellow) : 撤去 ○ (white) : 仮工事

	完了基数				
	伐採	仮設	基礎	組立	架線
下伊那南信幹	1/2 基	1/2 基	1/2 基	0/2 基	0/4 径間
豊丘線	9/9 基	10/10 基	9/10 基	8/10 基	5/11 径間
小渋川線	20/20 基	19/20 基	19/20 基	19/20 基	17/21 径間

送電線工事の進捗状況（豊丘村）


写真① 南信幹線No.147 組立工事（工事中）




写真② 豊丘線No.1～6 架線工事（完了）



送電線工事のスケジュール（豊丘村）

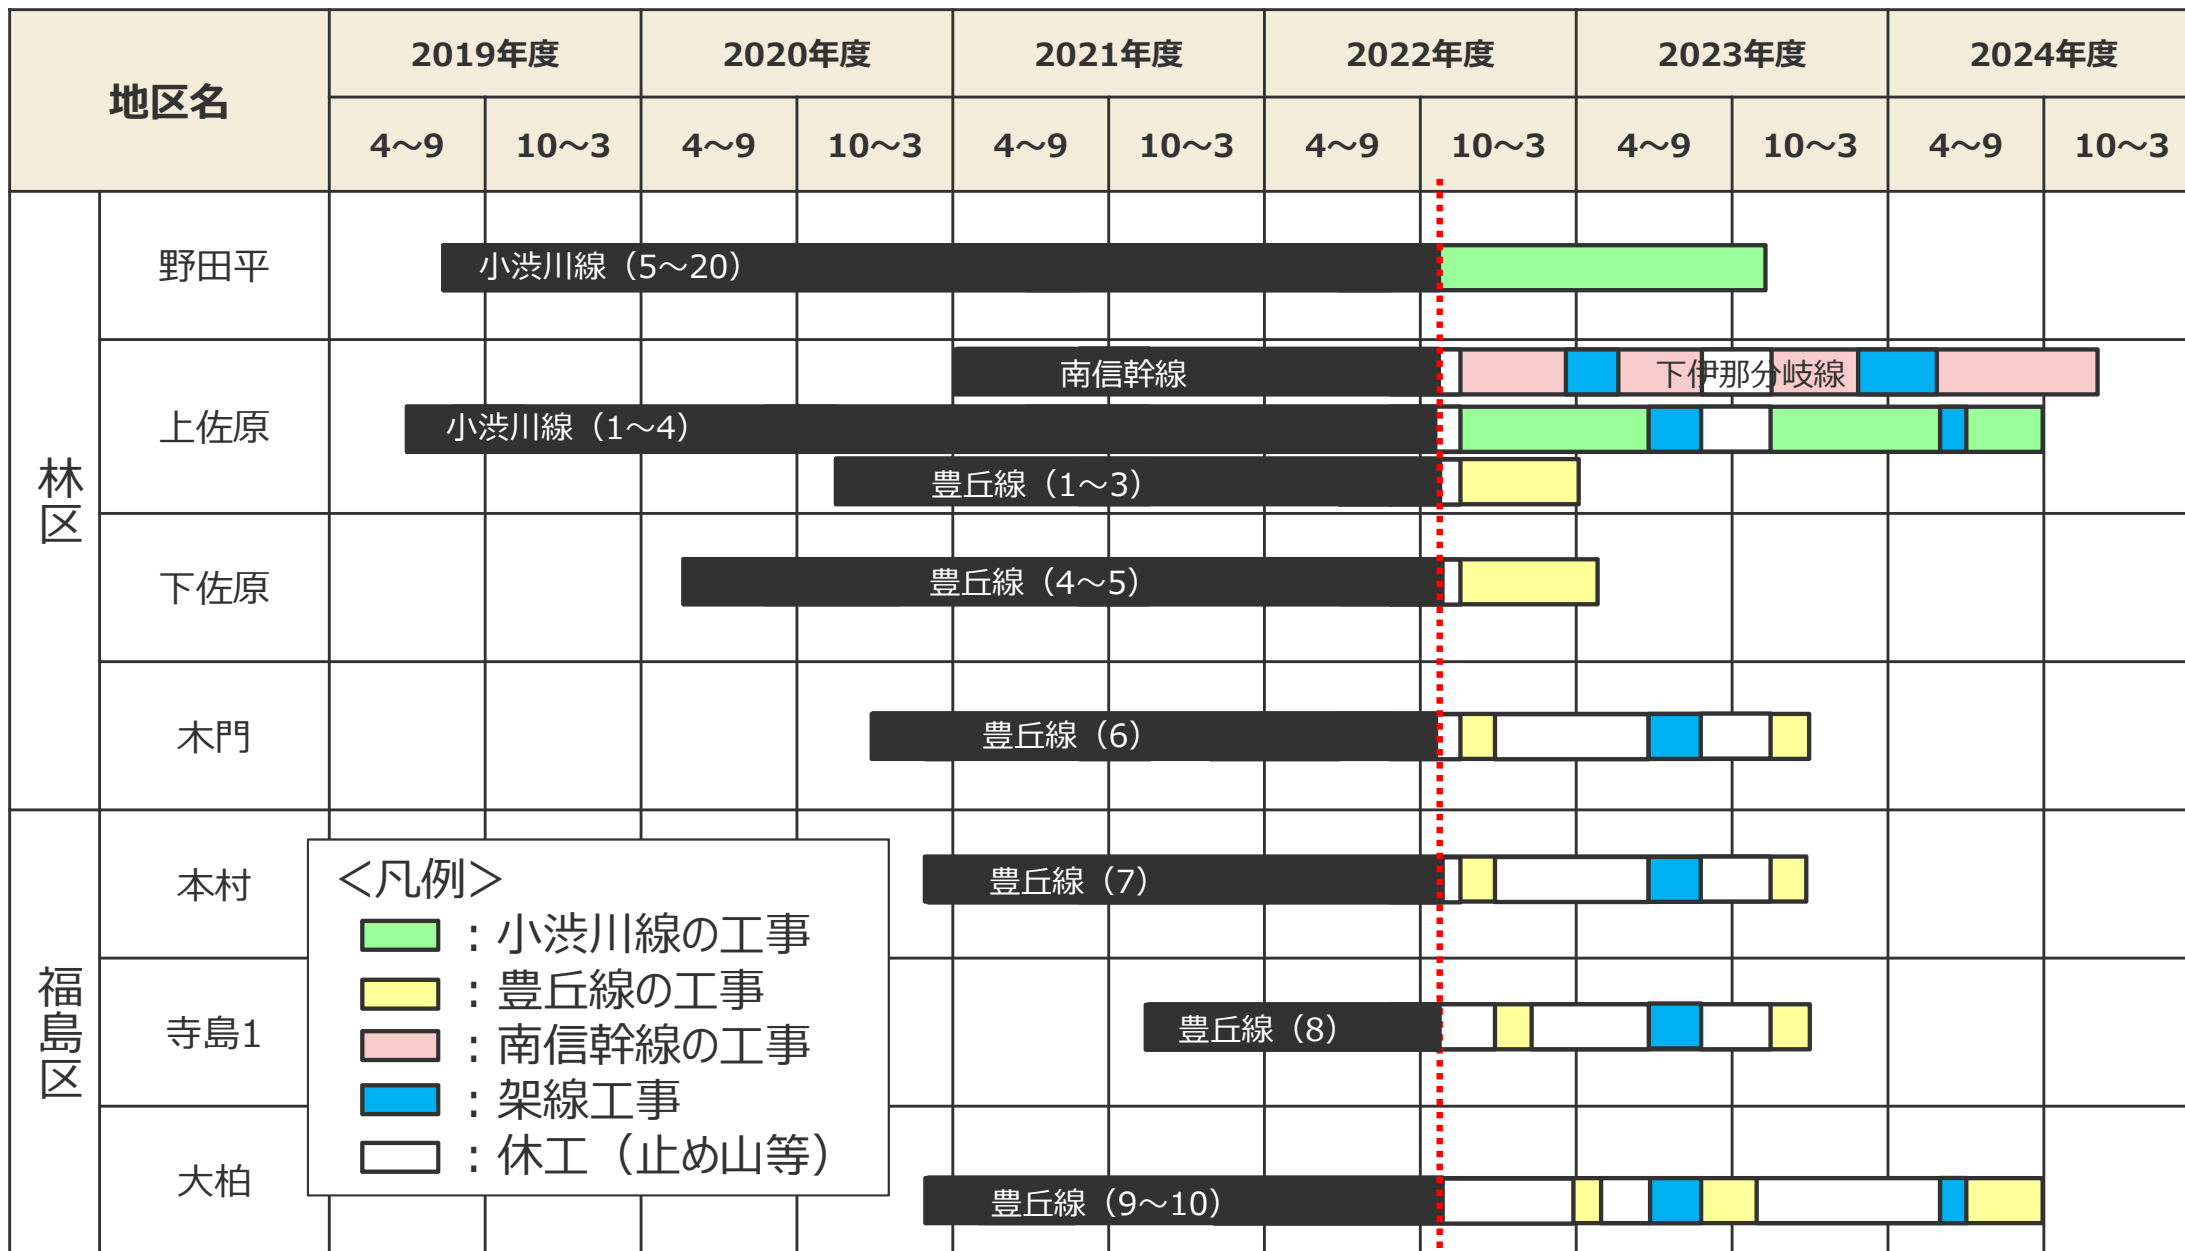

工事車両通行ルート

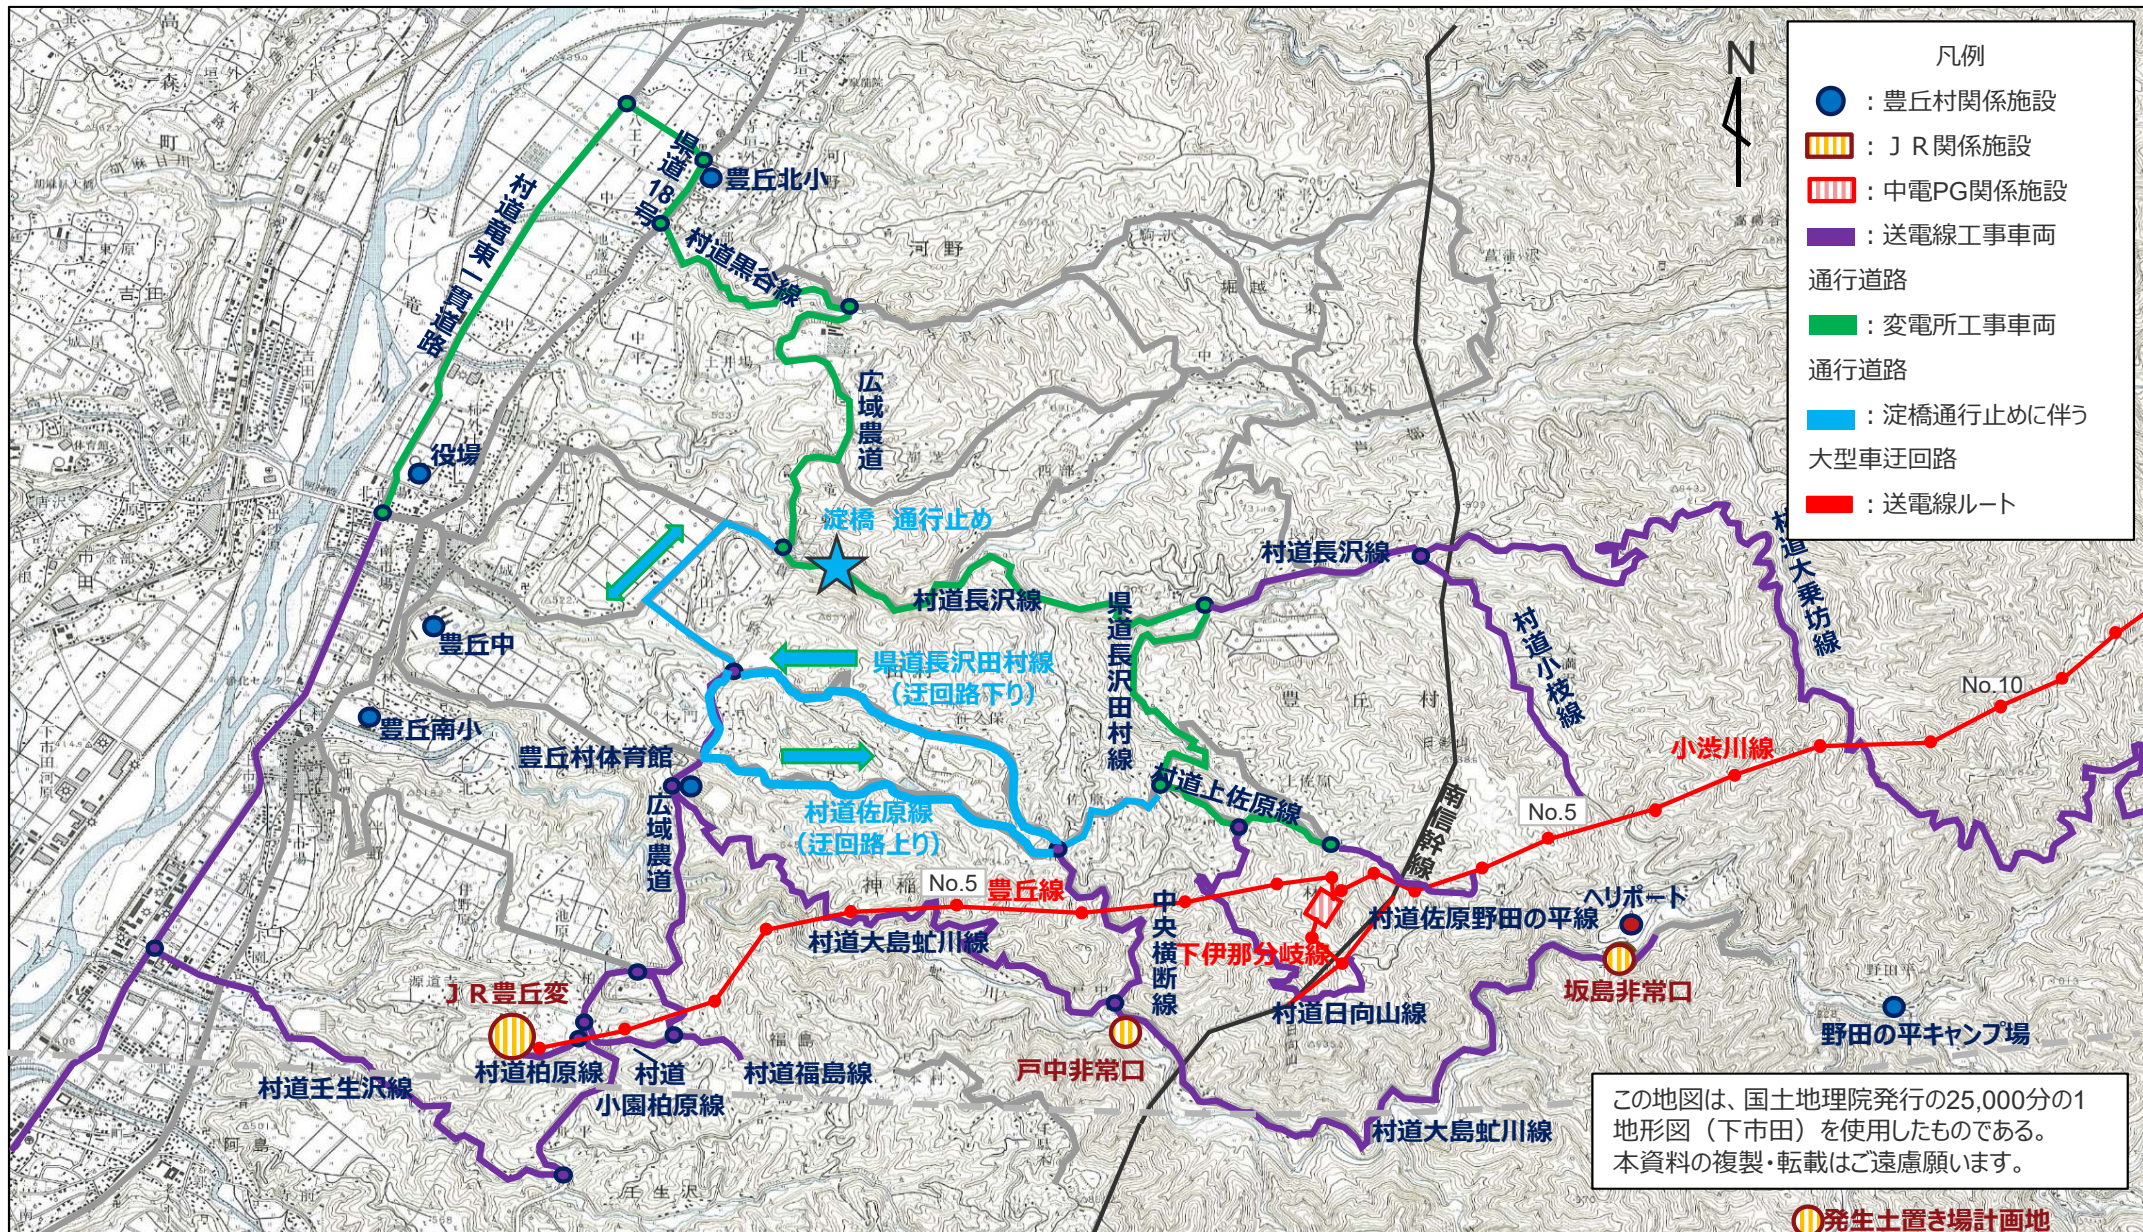

■中部電力パワーグリッド株式会社

リニア関連送変電工事所

〒395-0085 飯田市吾妻町100番地

TEL 0265-54-6902 fax 050-7771-9001

土日・祝日を除く、午前9時～午後4時30分まで



中部電力パワーグリッド
