


第32回豊丘村リニア対策委員会



東海旅客鉄道株式会社

1. 豊丘村内の工事概要
2. 各工区における工事の進捗状況について
3. 村道壬生沢線(開田～鬼の久保)道路改良事業(発生土活用)について
4. 「豊丘村内発生土置き場(本山)における環境保全について」に関する長野県からの助言についての対応方針について

1. 豊丘村内の工事概要
2. 各工区における工事の進捗状況について
3. 村道壬生沢線(開田～鬼の久保)道路改良事業(発生土活用)について
4. 「豊丘村内発生土置き場(本山)における環境保全について」に関する長野県からの助言についての対応方針について

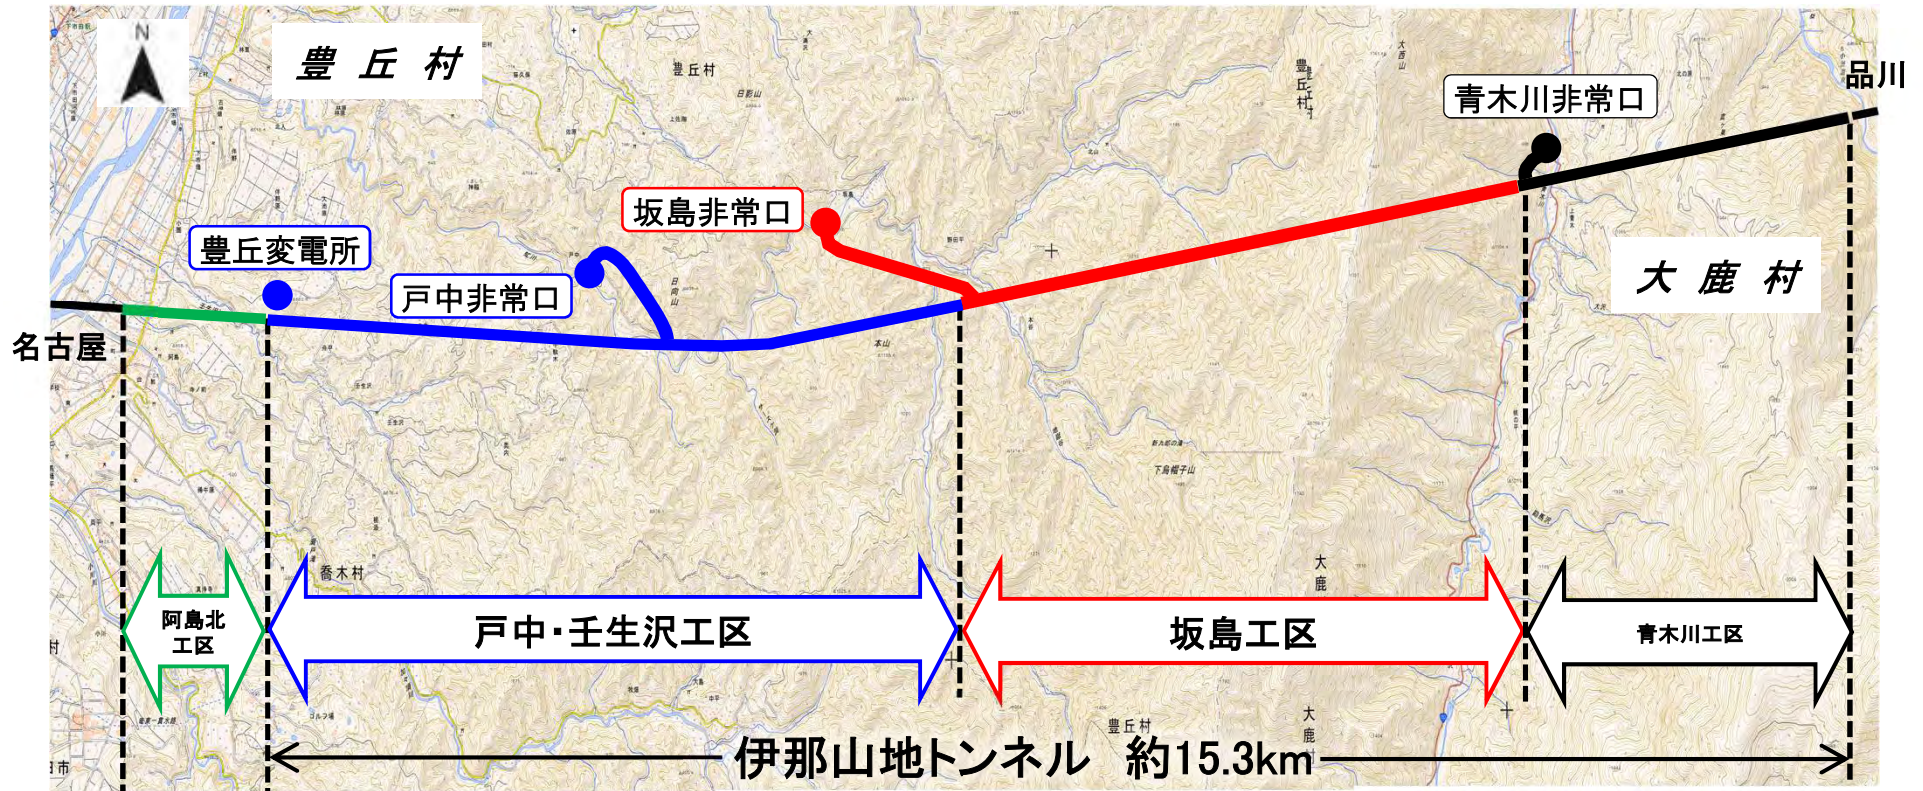


工事名称	中央新幹線阿島北高架橋ほか 新設	中央新幹線伊那山地トンネル 新設(戸中・壬生沢工区)	中央新幹線伊那山地トンネル 新設(坂島工区)
請負会社	飛島建設(株)、神稲建設	飛島建設(株)、(株)市川工務店	清水建設(株)、大日本土木(株)
施工延長	約1.1km	約6.6km	約5.1km
路盤工 完了見通	2028年度末	2030年度冬頃	2031年度冬頃

豊丘村内の工事箇所(R8. 5時点)



1. 豊丘村内の工事概要
2. 各工区における工事の進捗状況について
3. 村道壬生沢線(開田～鬼の久保)道路改良事業(発生土活用)について
4. 「豊丘村内発生土置き場(本山)における環境保全について」に関する長野県からの助言についての対応方針について

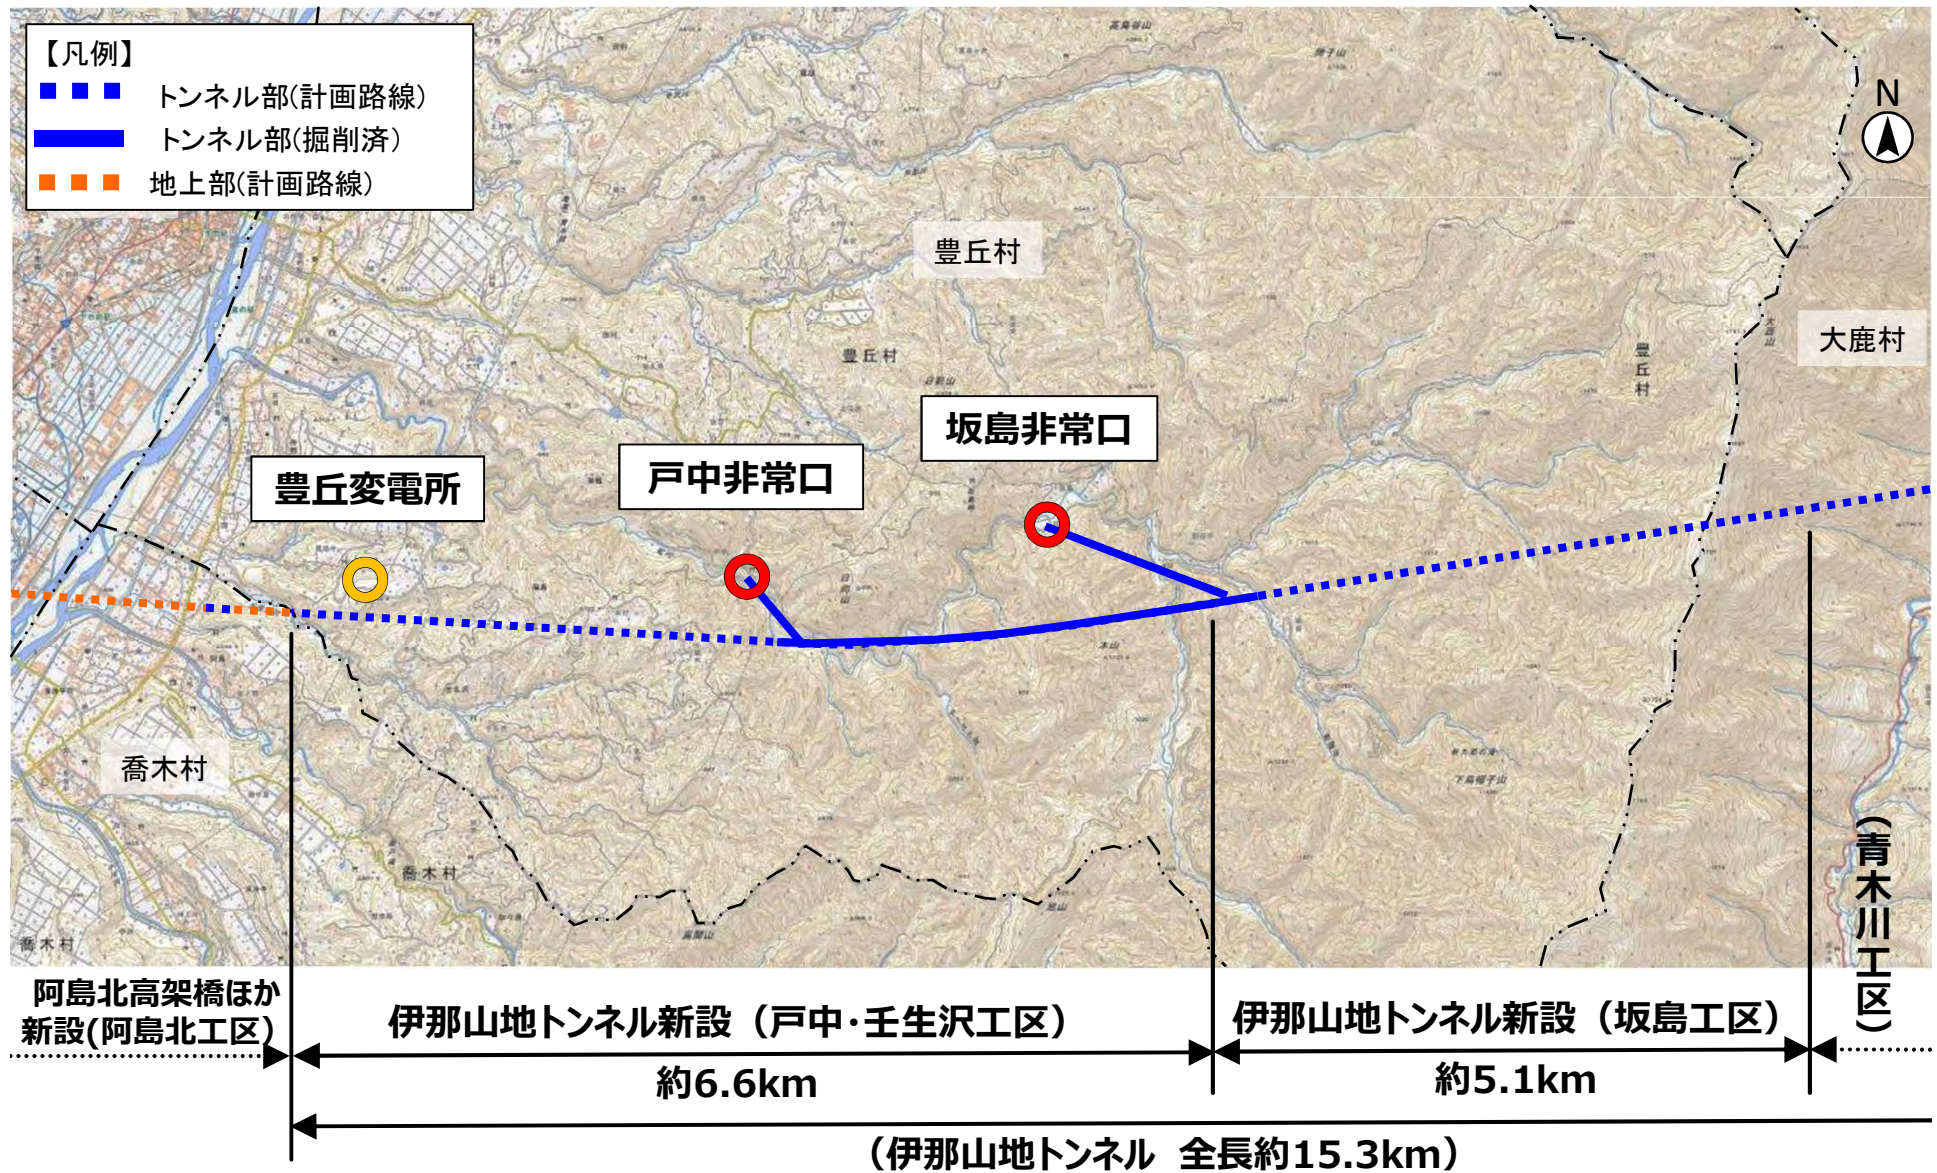


【トンネル工事】

- ・本坑の品川方面(東)にて地山の補強対策が完了し5月より掘削再開に向けた準備をしています。



【発生土置き場(本山)】

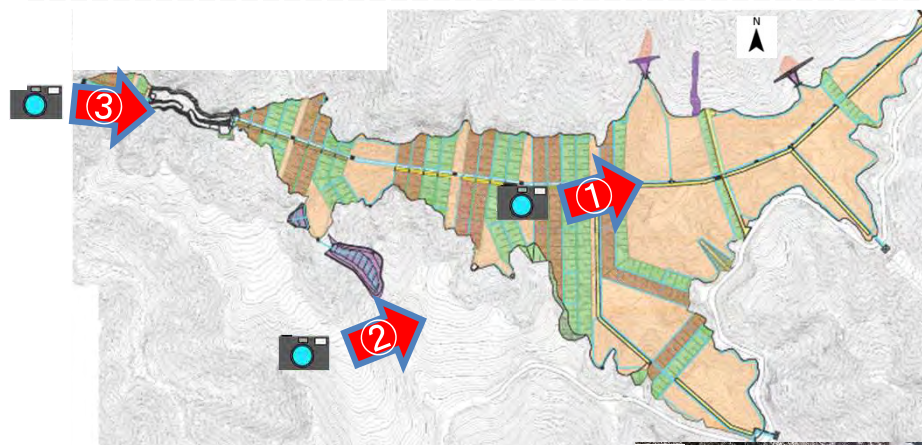


【トンネル工事】

- ・斜坑との交点から品川方(東)に向け約2.7kmを掘削し、2025年5月12日に無事貫通しました。
- ・名古屋方(西)に向けて約3.2kmの内、現在、約1割の掘削が完了しております。




【発生土置き場(戸中)】

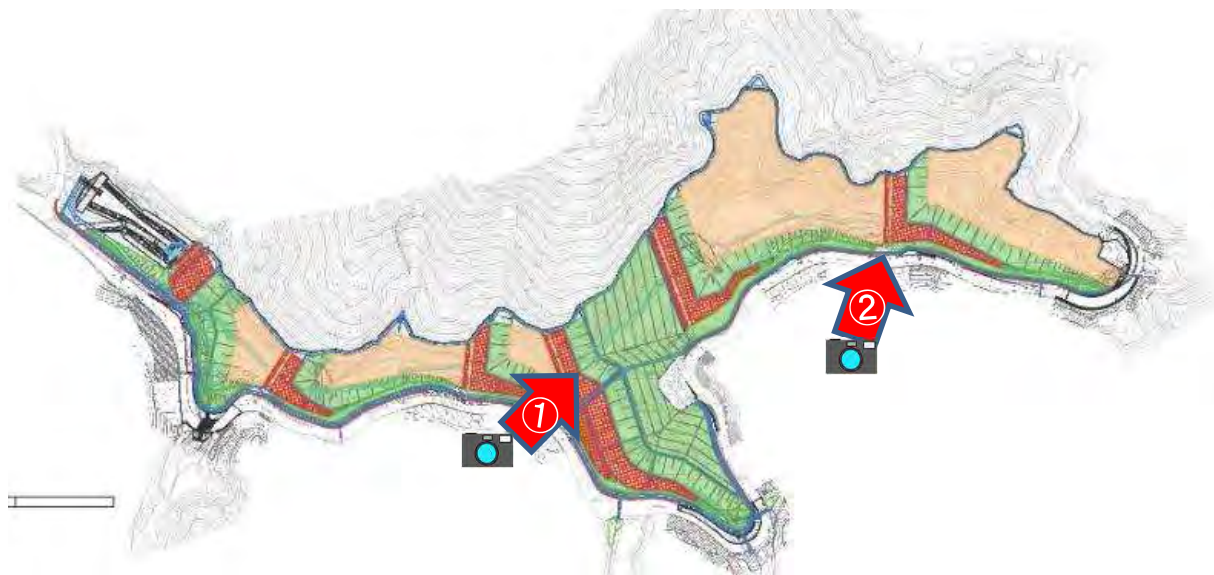

【豊丘変電所造成工事】

・村道の変電所北側への付替工事が完了し、現在は造成工事(盛土等)を進めております。

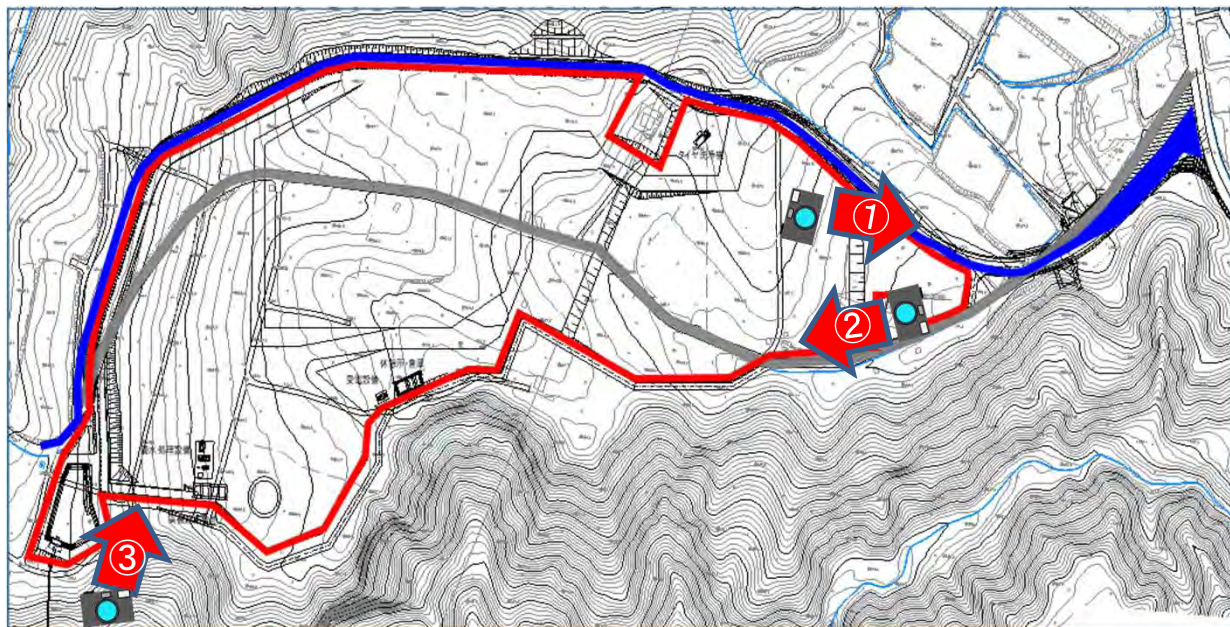

全景



村道付替完了




擁壁施工状況



補強盛土施工状況

【福島てっぺん公園駐車場整備事業】

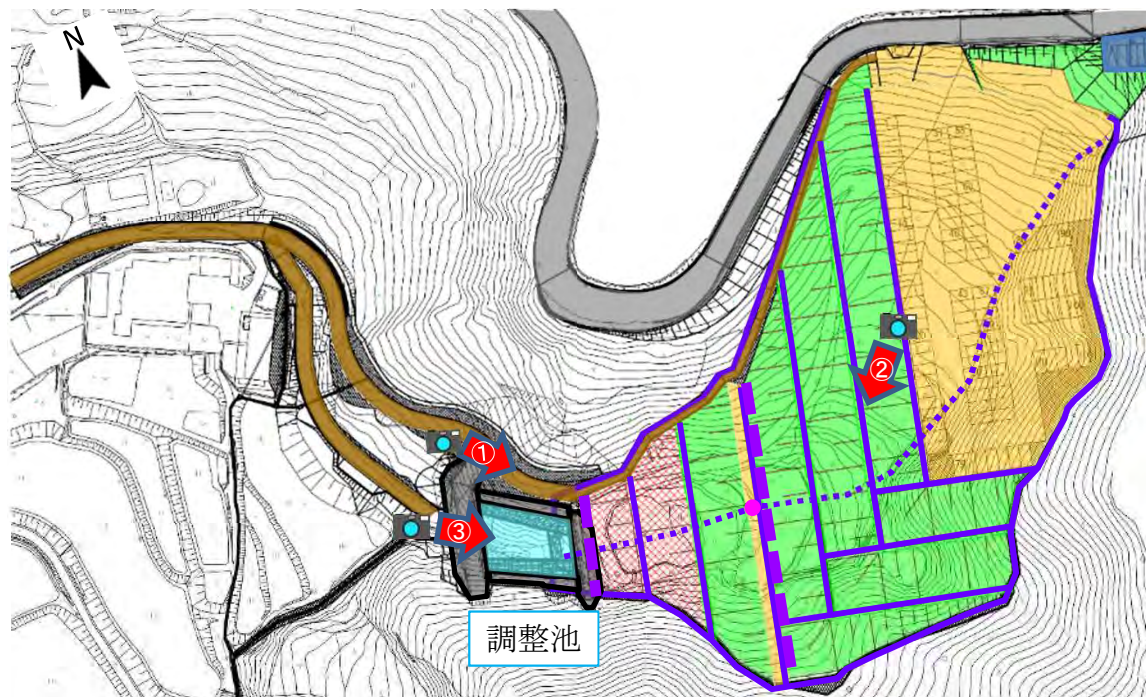

・管理用道路の整備が完了し、現在盛土を進めております。



【村道福島線・県道長沢田村線道路改良事業】

- ・村道福島線の道路改良は2025年7月に完了しました。
- ・県道長沢田村線の道路改良も2025年12月に完了いたしました。

【村道福島線】




【県道長沢田村線】





【阿島北高架橋区間】

- ・令和7年3月から開始した、阿島北工区(阿島北高架橋区間)の下部工工事を引き続き進めております。

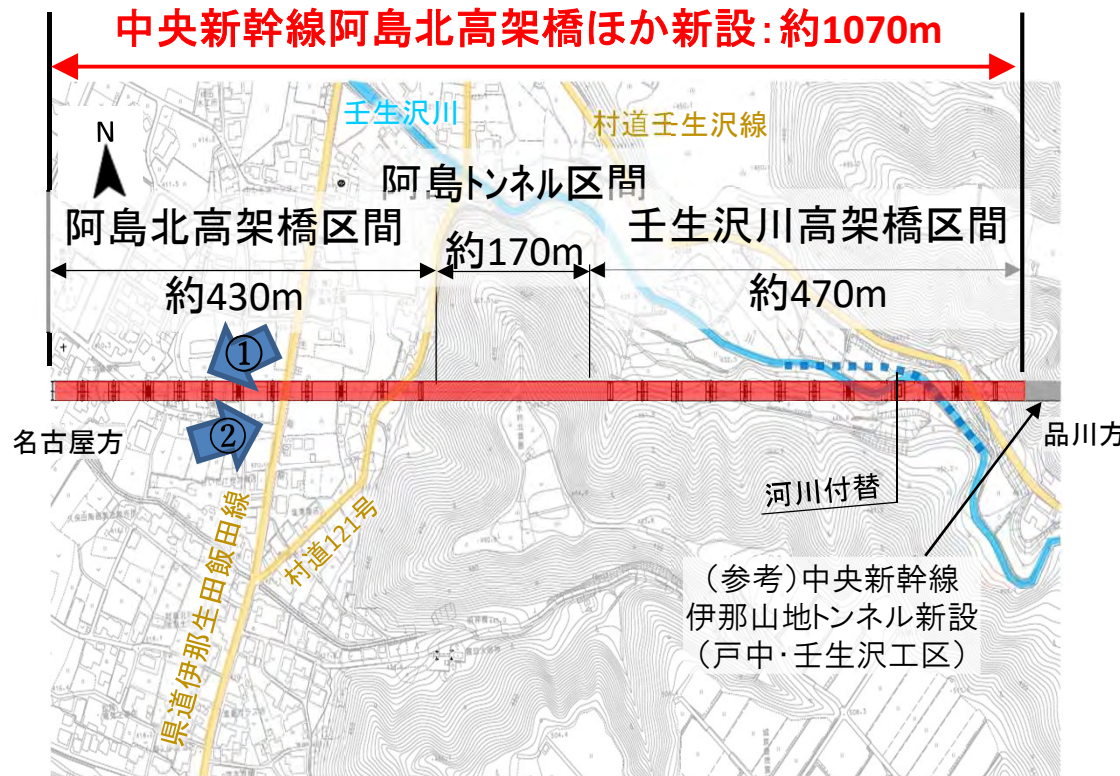

【壬生沢高架橋区間】

- 令和7年10月から壬生沢川高架橋区間のヤード整備(進入路造成)に工事着手し、現在は工事用栈橋の構築をしています。

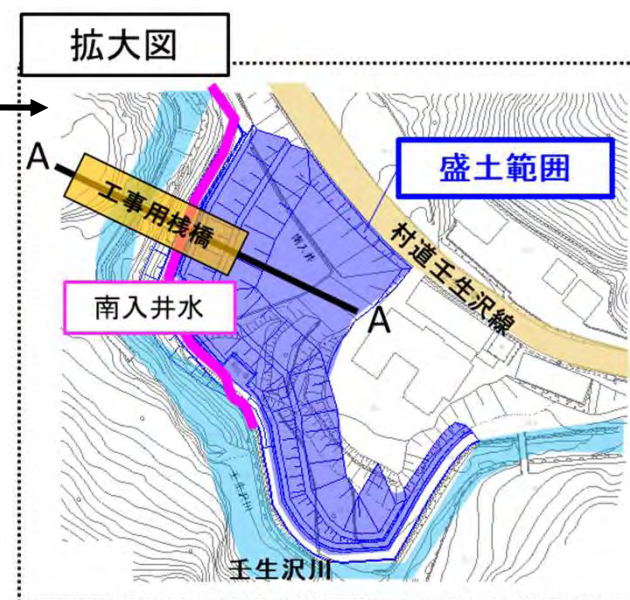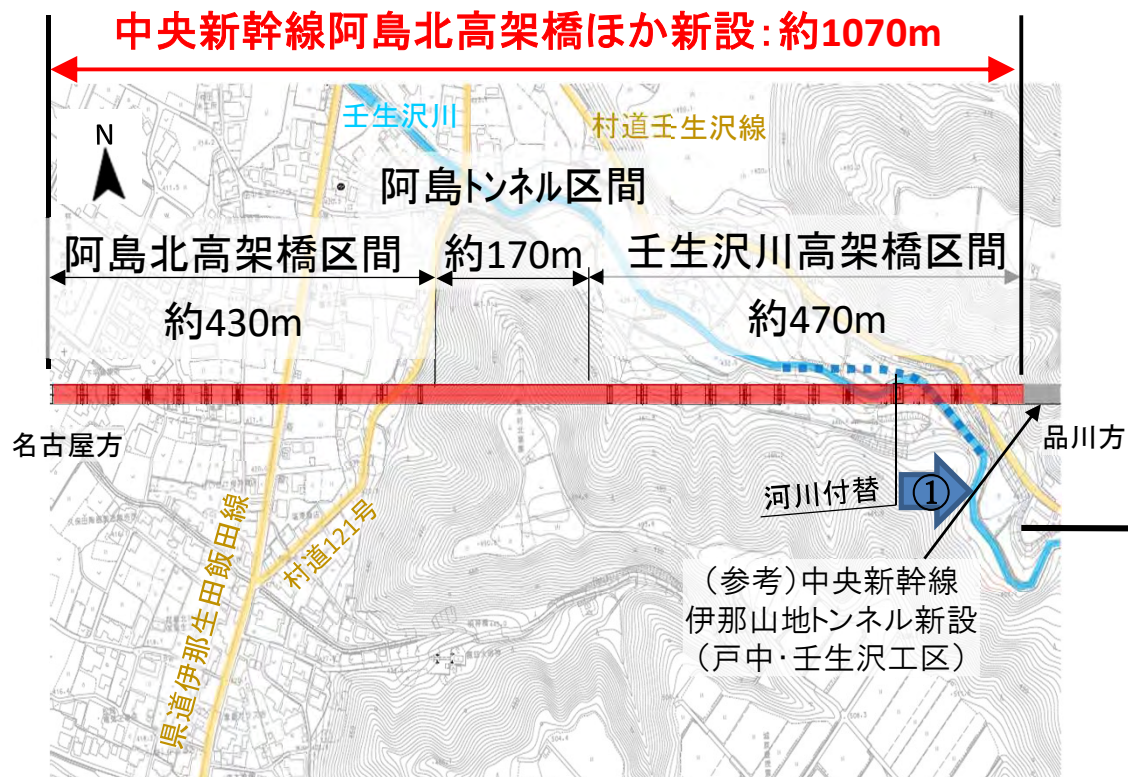

【村道城見田線・村道壬生沢線道路改良事業】

- ・令和7年7月から不動滝1号橋、2号橋、3号橋補修・補強工事を開始し、令和8年1月に完了しました。



【村道壬生沢線(開田～鬼の久保)道路改良事業】

- ・令和8年4月から準備工事に着手しました。令和8年6月より盛土工事を開始し、令和10年度上期に工事完了予定です。

豊丘村
300

※村道改良等、村事業の工事用車両はこちらのステッカーを貼付けて運行しています。(番号は、300番台を使用します。)

1. 豊丘村内の工事概要
2. 各工区における工事の進捗状況について
3. 村道壬生沢線(開田～鬼の久保)道路改良事業(発生土活用)について
4. 「豊丘村内発生土置き場(本山)における環境保全について」に関する長野県からの助言についての対応方針について

村道壬生沢線（開田～鬼の久保）道路改良事業 工事説明会


2026年3月4日(水) 19:00～
於: 壬生沢区民会館

事業者: 豊丘村

発注者: 東海旅客鉄道株式会社


施工者: 中央新幹線阿島北高架橋ほか新設工事共同企業体

- ・ 豊丘村が実施する村道壬生沢線(開田～鬼の久保)の道路改良工事にリニア中央新幹線の壬生沢川高架橋工事等に伴う発生土約5万m³を活用します。
- ・ 盛土高さは約3m～13mの補強盛土構造で、現況の村道壬生沢線の線形を改良して道路工事をします。
- ・ 盛土工事のほか、盛土直下にある竜東一貫水路の付替えや、駐車場の整備を実施します。

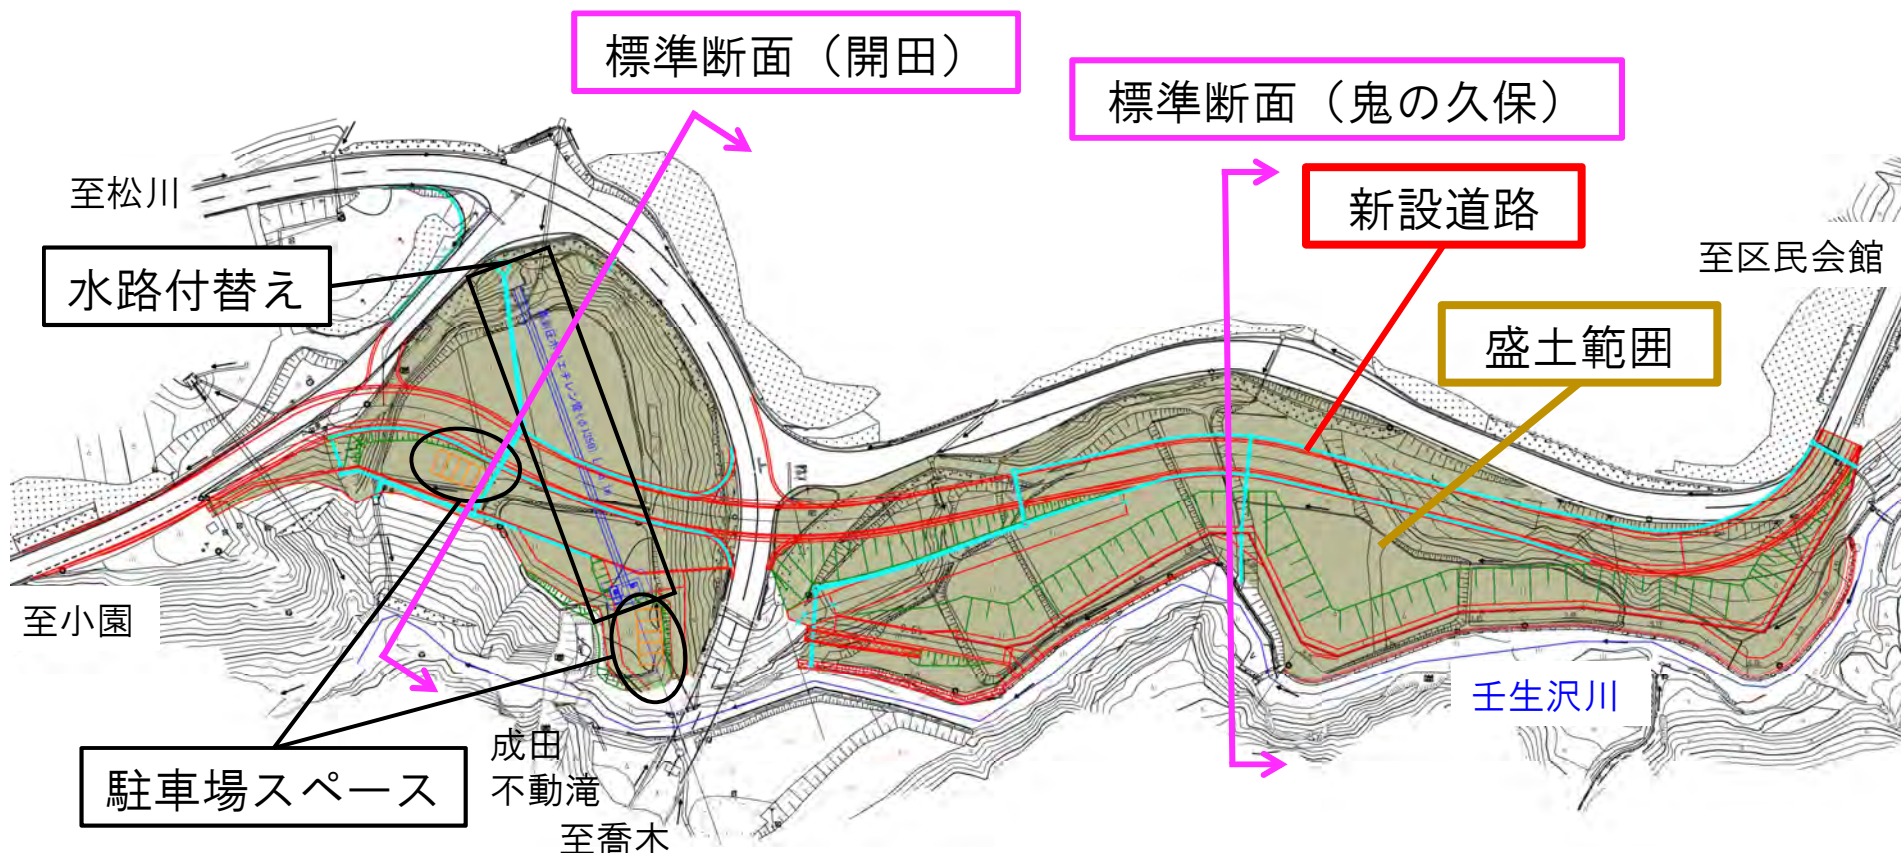


※構造物の形状や配置等については、協議によって変更になる可能性があります。

標準断面(開田)

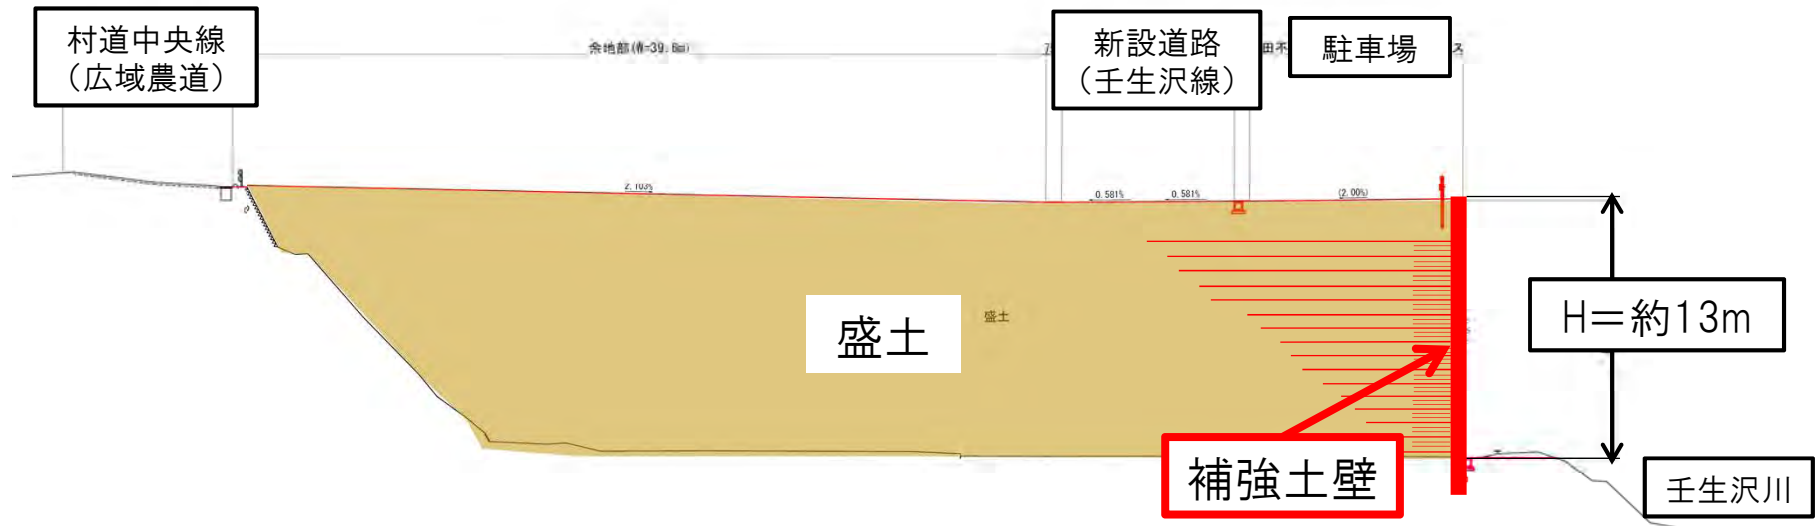

標準断面(鬼の久保)

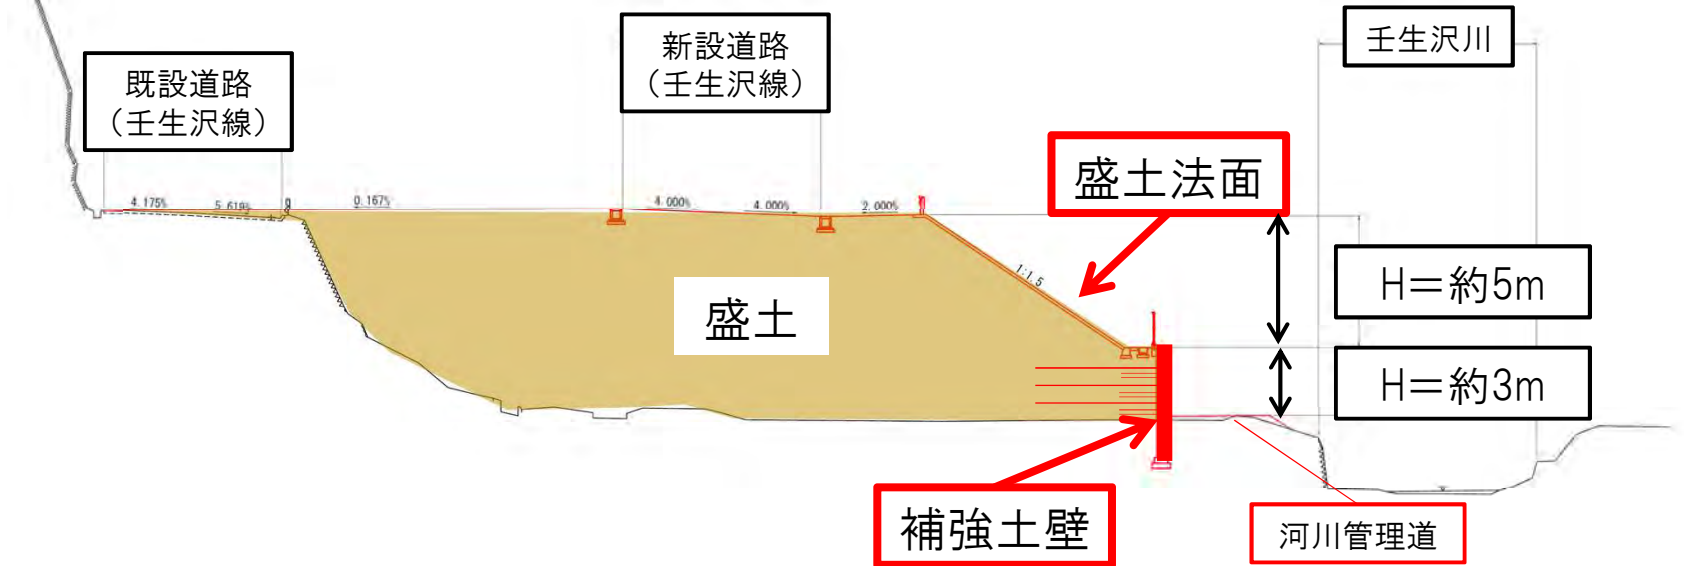

	25年度	2026年度				2027年度				2028年度	
	3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月
協議	村との協定締結 法令申請協議 ▼説明会										
開田	準備工	盛土工				盛土工					
		水路工(竜東一貫水路)				水路工(竜東一貫水路)				舗装工	
鬼の久保	準備工	盛土工				盛土工					
		護岸工				護岸工				舗装工	
リニア 壬生沢	仮棧橋工	発生土運搬等により 月別日平均最大台数:約100台/日				高架橋工事(ヤード整備含む)					


※協議および施工進捗により変更となる場合がございます。

- 壬生沢川高架橋工事に伴う発生土を運搬するため、村道壬生沢線を通行いたします。
- 盛土工事の際は、月別日平均最大台数 約100台/日の発生土運搬車両が通行する場合がございます。



①進入口整備(令和8年度春頃)

- ・ 既設道路を進入口として拡幅整備する際に、進入口の整備のため、村道壬生沢線において約1週間の終日片側交互通行を実施します。

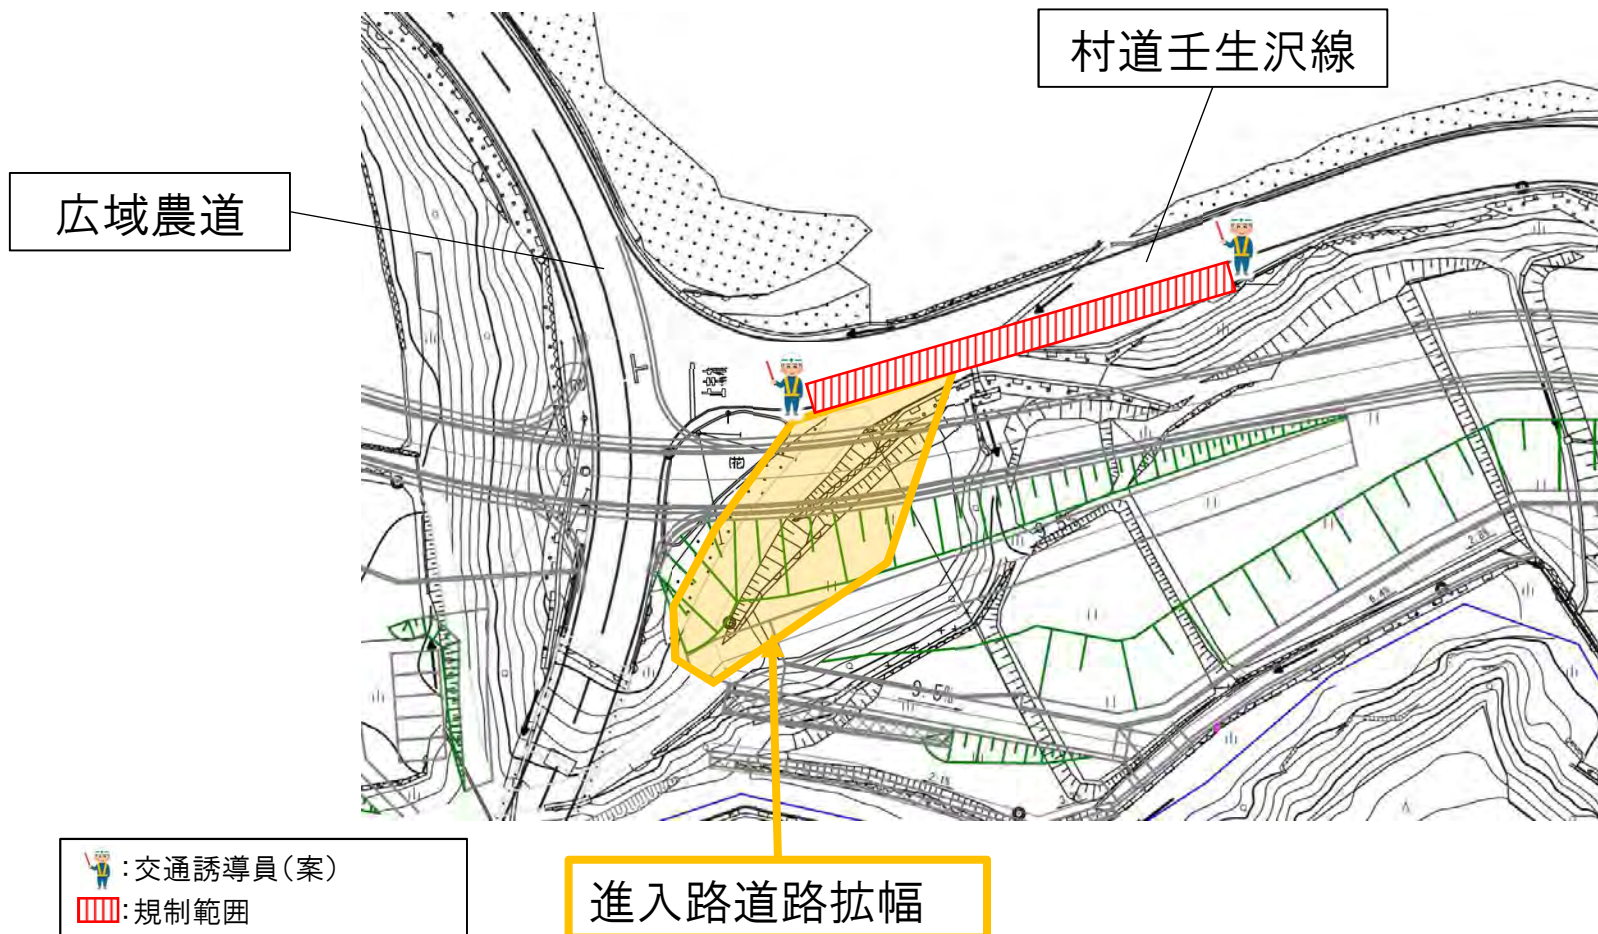

※交通規制に関する詳細な内容は変更になる可能性があります。

※今後、開田側の進入口整備や現況道路との擦り付け工事の際に交通規制が生じる場合があります。

追加の交通規制があった際は、回覧等により改めて周知をいたします。

- ・発生土運搬車両には「豊丘村事業の工事であること」がわかるように、ステッカーなどを貼り付けて、明示を行います。



※左右各1枚、前後各1枚 計4枚設置



標識のダンプ明示状況イメージ

- ・工事用車両のタイヤ洗浄
- ・車両の出入口等の散水、洗浄
- ・工事従事者への講習・指導(新規入場時、安全教育時)
- ・環境負荷低減を意識した運転の徹底
- ・定期的な車両の点検、整備による性能維持

車両のタイヤ洗浄状況



イメージ写真

散水、洗浄状況



イメージ写真

※現時点の計画であり、今後の協議により変更の場合があります

1. 豊丘村内の工事概要
2. 各工区における工事の進捗状況について
3. 村道壬生沢線(開田～鬼の久保)道路改良事業(発生土活用)について
4. 「豊丘村内発生土置き場(本山)における環境保全について」に関する長野県からの助言についての対応方針について

中央新幹線 伊那山地トンネル新設(坂島工区)

「豊丘村内発生土置き場(本山)における環境保全について」に関する長野県からの助言についての対応方針に関する説明会

・2026年5月21日(木) 18:30～ 交流学習センター『ゆめあるて』

事業者: 東海旅客鉄道株式会社

施工者: 伊那山地トンネル新設(坂島工区)工事共同企業体

お問い合わせ先

2025.5.20
JR東海

JR東海	東海旅客鉄道株式会社 中央新幹線長野工事事務所 (電話)0265-38-6500 環境保全事務所(長野) (電話)0265-52-6511 (住所)長野県飯田市元町5451
伊那山地(坂島工区) 清水建設・大日本土木JV	中央新幹線伊那山地トンネル新設(坂島工区)工事共同企業体事務所 (住所)長野県下伊那郡豊丘村神稻9440-1 (電話)0265-49-8416
伊那山地(戸中・ 壬生沢工区) 飛島建設・市川工務店JV	中央新幹線伊那山地トンネル新設(戸中・壬生沢工区)工事共同企業体事務所 (住所)長野県下伊那郡豊丘村神稻9105-1 (電話)0265-49-0502
阿島北工区 飛島建設・神稻建設JV	中央新幹線阿島北高架橋ほか新設工事共同企業体事務所 (住所)長野県飯田市座光寺6501 (電話)0265-49-8314

※ 受付：土・日・祝日・年末年始・GW・お盆を除く平日 9時～17時
